




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 2851

Data: 22/08/2024

Empenho Nº: 404 / 6

Credor: 1598 - MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



Valor Bruto R\$: 657.739,17

Valor Retido R\$: 42.095,30

Valor Líquido R\$: 615.643,87

Dotação Orçamentária

Reduzido: 1004.51.1754

Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITACÃO E URBANISMO

Ação: 1.004 - INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES

Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte: 754 - Operações de Créditos Internas

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc	Valor
24378-7	Operação de Crédito - DESENBÁHIA	3716-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082201	615.643,87



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 308-2023

EMPENHO: 404 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 30/01/2024	Data Sub-Empenho: 20/08/2024	Data Liquidação: 22/08/2024
		Data Pagamento: 22/08/2024

Fornecedor		
Nome:	1598 - MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	RUA BARAO DE JEREMOABO, 69	Complemento: CASA SALA 03
Bairro:	CENTRO	Cidade:
CNPJ:	14.184.136/0001-03 Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -
Tipo PIX:	Nº PIX:	



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1004.51.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	10.01. - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
Função:	15- Urbanismo
Sub-Função:	451- Infra-estrutura Urbana
Programa:	006- REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAIS DAS ÁGUAS TERMAIS
Ação:	1.004- INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
Elemento:	4.4.90.51.00- Obras e Instalações
Fonte:	754- Operações de Créditos Internas
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01- OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenhari.	Nº Lic.: CP-001-2023	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
Convênio:	Contrato: 020-2024	5.000,00	5.000,00	0,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO Valor que se emite em favor do Credor acima para custear Despesas com contratação de empresa especializada para construção e requalificação de praças no município de Cipó-BA, referente ao Período de 01/06/2024 à 25/07/2024, conforme Nota Fiscal de nº 210 e Boletim de Medição Nº 3 em anexo, correspondente ao Lote 01. - Contrato de Nº 020/2024 com Valor Total de R\$ 5.439.420,27. - Processo Administrativo Nº 308/2023 - Concorrência Pública Nº 001/2023	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	657.739,17	657.739,17	0,00

Data do Empenho: 30/01/2024	Data do Liquidação: 22/08/2024	Data do Pagamento: 22/08/2024
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Seiscentos e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos ##	Valor Bruto	657.739,17
---	-------------	------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 657.739,17 (Seiscentos e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), proveniente desta nota. Em, 22/08/2024  JOSÉ MARQUES DOS REIS Prefeito Municipal CPF: 444.309.495-49	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 22/08/2024  CAMILA JESUS DOS SANTOS ASSIS Secretária da Fazenda CPF: 049.154.845-13
---	--


IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
24378-7	Operação de Crédito - DESENBANHIA	3716-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	082201	615.643,87

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 2828 / 2024

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ a importância supra de R\$ 657.739,17 (Seiscentos e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 2828, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.

3393015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRAÇA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPÓ - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 308-2023

EMPENHO: 404 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 20/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	1598 - MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço:	RUA BARAO DE JEREMOABO, 69
Bairro:	CENTRO
CNPJ:	14.184.136/0001-03
Conta:	
Tipo PIX:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Nº PIX:	
Cidade:	
CPF:	
Banco:	
RG:	
Estado:	
Complemento:	CASA SALA 03

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	1004.51.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho: 30/01/2024	
Unidade:	10.01. - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	006 - REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAIS DAS ÁGUAS TERMAIS
Ação:	1.004 - INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	754 - Operações de Créditos Internas
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	CP-001-2023	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	020-2024	5.000,00	5.000,00	0,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO Valor que se emite em favor do Credor acima para custear Despesas com contratação de empresa especializada para construção e requalificação de praças no município de Cipó-BA, referente ao Período de 01/06/2024 à 25/07/2024, conforme Nota Fiscal de nº 210 e Boletim de Medição Nº 3 em anexo, correspondente ao Lote 01. - Contrato de Nº 020/2024 com Valor Total de R\$ 5.439.420,27. - Processo Administrativo Nº 308/2023 - Concorrência Pública Nº 001/2023 - Operações de Créditos Internas - Desembahia	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	657.739,17	657.739,17	0,00

Data do Empenho: 30/01/2024	Data do Liquidação: 22/08/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.08.00.02.27	PMC - ISS Fonte 754 - Operação de Crédito	13.154,78
2.1.8.8.3.01.02.00.26.00	PMC - INSS - FONTE 754 - Operação de Crédito	28.940,52
## Seiscentos e quinze mil e seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos ##		Valor Retido 42.095,30
		Valor Líquido 615.643,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/08/2024	210	N			657.739,17
Quantidade: 1	Total:					657.739,17

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	657.739,17

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados de acordo com atestado na Nota Fiscal e/ou Documento em anexo. Em 22/08/2024.	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/08/2024, podendo efetuar o pagamento.
 CIBELLE MARQUES COSTA SANTOS Assessor Contábil CPF: 029.717.915-21	 MAIANNE MACEDO SILVA Secretário de Obras, Hab. e Urbanismo CPF: 062.456.545-99



PROCESSO ADM: 308-2023

EMPENHO: 404/2024 Nº ACRÉSCIMO: 5 Data do Acréscimo: 20/08/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR					
Nome:	1598 - MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA BARAO DE JEREMOABO, 69			Complemento: CASA SALA 03	
Bairro:	CENTRO	Cidade:			
CNPJ:	14.184.136/0001-03	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

Reduzido: 1004.51.1754 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 30/01/2024

Unidade:	10.01. - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	006 - REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAIS DAS ÁGUAS TERMAIS
Ação:	1.004 - INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	754 - Operações de Créditos Internos
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade: Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.: CP-001-2023	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 020-2024	5.000,00	5.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Acréscimo	Saldo Atual
Suplementação do Empenho que se emite em favor do Credor acima para custear Despesas com contratação de empresa especializada para construção e requalificação de praças no município de Clpó-BA. - Contrato de Nº 020-2024 com Valor Total - R\$ 5.439.420,27 Para Lote 01 e Lote 02. - Processo Administrativo Nº 308-2023 - Concorrência Pública Nº 001-2023 - Operações de Créditos Internas.	0,00	657.739,17	657.739,17

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Seiscentos e cinquenta e sete mil e seiscientos e trinta e nove reais e dezessete centavos. ### 657.739,17

Autorizo o acréscimo desta despesa supra mencionada em 20/08/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/08/2024

JOSÉ MARQUES DOS REIS
 Prefeito Municipal
 CPF: 444.309.495-49

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA
Chefe Execução Orçamentária e Registro Contábeis
CPF: 713.465.895-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PRACA JURACY MAGALHÃES - CENTRO

CNPJ: 13.808.936/0001-95 - CEP: 48.450-000 - CIPO - BA



NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 308-2023

EMPENHO: 404/2024 Data do Empenho: 30/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome:	1598 - MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA BARAO DE JEREMOABO, 69			Complemento: CASA SALA 03	
Bairro:	CENTRO	Cidade:		Estado:	
CNPJ:	14.184.136/0001-03	Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco:	-
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 1004.511754 - ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR

Unidade:	10.01. - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
Função:	15 - Urbanismo
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana
Programa:	006 - REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAIS DAS ÁGUAS TERMAIS
Ação:	1.004 - INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte:	754 - Operações de Créditos Internas
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES (MAO DE OBRA)

Modalidade:	Concorrência para obras e serviços de engenharia	Nº Lic.:	CP-001-2023	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	020-2024	5.000,00	5.000,00	0,00
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO

Empenho que se emite em favor do Credor acima para custear Despesas com contratação de empresa especializada para construção e requalificação de praças no município de Cipó-BA.

- Contrato de Nº 020-2024 com Valor Total - R\$ 5.439.420,27 Para Lote 01 e Lote 02.
- Processo Administrativo Nº 308-2023
- Concorrência Pública Nº 001-2023
- Operações de Créditos Internas.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Cinco mil reais. ## 5.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/01/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/01/2024

JOSÉ MARQUES DOS REIS
 Prefeito Municipal
 CPF: 444.309.495-49

WANDERLEI DOS SANTOS SANTANA
Chefe Execução Orçamentária e Registro Contábeis
CPF: 713.465.895-34

3221698



Emissão de comprovantes

G337221117843065
22/08/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.27
3716803716 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMC DESENBAHIA

AGENCIA: 3716-8 CONTA: 24.378-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMC DESENBAHIA

BANCO: 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO

AGENCIA: 4530-6 - AGENCIA ARACI

CONTA: 654.496-7

FAVORECIDO: MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPRE

CPF/CNPJ: 14.184.136/0001-03

VALOR: R\$ 615.643,87

DEBITO EM: 22/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: E.68E.C5E.CD0.F46.847

Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://e.ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número do Nota Fiscal
210

Número da Nota Fiscal

Data e Hora da Emissão
16/08/2024 às 13:25:21

Código de Verificação
6350 - 6033 - 6581

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário 00378627 Inscrição Municipal 00378627
Razão Social MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E CNPJ/CPF 14.184.136/0001-03
Logradouro BARAO DE JEREMOABO Número 69
Bairro CENTRO Cep 48.760-000
Município ARACI UF BA
Inscrição Estadual

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social MUNICIPIO DE CIPO CNPJ/CPF 13.808.936/0001-95
Logradouro PRAÇA JURACY MAGALHÃES Número S/N
Bairro CENTRO Cep 48.450-000
Município CIPO UF BA
Inscrição Estadual

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
80	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE À 03ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPO-BA. CONTRATO Nº 020/2024.	263095,6700	1,0000	0,0000	263095,6700

Valor Total dos Serviços R\$ 263.095,67

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
1453	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REFERENTE À 03ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPO-BA. CONTRATO Nº 020/2024.	394643,5000	1,0000	394643,5000

Valor Total dos Materiais R\$ 394.643,50

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPO-BA. CONTRATO Nº 020/2024. LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023. EGUINDO BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

MÃO DE OBRA 40%: R\$ 263.095,67
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 60%: R\$ 394.643,50
INSS 11% 28.940,52

DADOS BANCARIOS: BANCO CRESOL - AGÊNCIA 4530 - C/C 654496-7

SERVIÇO PRESTADO

Nome do Responsável

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R\$ 657.739,17

Operação
Com lançamentos de materiais
Optante pelo Simples ?
Sim

Deduz Materiais?
Sim
Local do Serviço
Fora do Município

Responsável
Contratante, tomador do serviço
Situação da Nota
Simples Nacional

Atividade
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Valor Total das Deduções R\$ 394.643,50	Base de Cálculo R\$ 263.095,67	Alíquota % 5,00	Valor do ISS R\$ 13.154,78	Valor Total Retido R\$ 42.095,30
--	-----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------------

RETENÇÕES

PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 28.940,52	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	-----------------------	------------------	--------------------	----------------	------------------------------



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

Valor Líquido da Nota R\$ 615.643,87

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 14.184.136/0001-03
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 210 - emitida em: 16/08/2024 às 13:25:21 com o código de verificação: 6350 - 6033 - 6581

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



MONAKO
EMPREENDEIMENTOS



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM

MUNICÍPIO: CIPÓ-BA		CONTRATO	MEDIÇÃO
EMPREENDIMENTO:	Contratação de empresa especializada para construção e requalificação de praças no município de Cipó-BA.,	NÚMERO: 020/2024	NÚMERO: 3
PROJETO/ORA:	Execução de construção e requalificação de praças no município de Cipó-BA.	EMPRESA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS	VALOR: 657.739,17
OBRA / TIPO:	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO	DATA ASSIN.: 30/01/24 DATA PUBLIC.: 30/01/24	PERÍODO MEDIDO: 01/06/24 A 25/07/24
Valor do contrato		R\$ 4.519.228,48	VALOR ACUMULADO: 2.394.574,48
LOTE 01			SALDO A MEDIR: R\$ 2.124.654,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADAS	SALDO	MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADOS	SALDO	
				UNITÁRIO	TOTAL							
1	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA FAZENDA TAMANDUÁ (ELPIDIO GAMA)				273.739,79				R\$	49.477,54	R\$	214.248,69
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				13.287,86				R\$	-	R\$	13.287,86
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26		6,00	-	R\$	-	R\$	2.530,26
1.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	894,01	1,52	1.358,89		894,01	-	R\$	-	R\$	1.358,89
1.1.3	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	m²	8	841,33	6.730,64		8,00	-	R\$	-	R\$	6.730,64
1.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51		1,00	-	R\$	-	R\$	2.014,51
1.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	653,56	653,56		1,00	-	R\$	-	R\$	653,56
1.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				106.039,29				R\$	-	R\$	106.039,29
1.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	145,61	0,78	113,57		145,61	-	R\$	-	R\$	113,57
1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2018	M	54,88	60,82	3.314,70		54,88	-	R\$	-	R\$	3.314,70
1.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	169	127,53	21.552,57		169,00	-	R\$	-	R\$	21.552,57
1.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	483,83	95,91	46.404,13		483,83	-	R\$	-	R\$	46.404,13
1.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	200,84	102,92	20.670,45		200,84	-	R\$	-	R\$	20.670,45



1.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	161,5	54,55	8.264,32		151,50	-	R\$	-	R\$	8.264,33	0,00
1.2.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	14,3	227,06	3.246,95		14,30	-	R\$	-	R\$	3.246,95	0,00
1.2.8	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	un	2	1.236,30	2.472,60		2,00	-	R\$	-	R\$	2.472,60	-
1.3	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				59.491,04				R\$	-	R\$	59.491,04	
1.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13		-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.842,13
1.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17		-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.518,17
1.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50		-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.915,50
1.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92		-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.956,92
1.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67		-	1,00	R\$	-	R\$	-	6.400,67
1.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3	3.209,85	9.629,85		-	3,00	R\$	-	R\$	-	9.629,85
1.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58		-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.991,58
1.3.8	INSTALAÇÃO DE LONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40		-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.913,40
1.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72		-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.100,72
1.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00		-	2,00	R\$	-	R\$	-	4.784,00
1.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10		-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.438,10
1.4	PARQUE INFANTIL				12.895,66				R\$	-	R\$	12.895,66	
1.4.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1	1.679,63	1.679,63		1,00	1,00	-	R\$	1.679,63	R\$	1.679,63
1.4.2	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51		1,00	1,00	-	R\$	3.005,51	R\$	3.005,51
1.4.3	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55		1,00	1,00	-	R\$	3.450,55	R\$	3.450,55
1.4.4	Brinquedo - Gira-gira (carrusel a=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada a=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97		1,00	1,00	-	R\$	4.759,97	R\$	4.759,97
1.5	PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO				45.509,58				R\$	-	R\$	45.509,57	0,00
1.5.1	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	122,44	31,40	3.844,61		122,44	122,44	-	R\$	3.844,61	R\$	3.844,61
1.5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5	523,73	2.618,65		5,00	5,00	-	R\$	2.618,65	R\$	2.618,65
1.5.3	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22	230,82	5.078,04		22,00	-	R\$	-	R\$	5.078,04	-



1.5.4	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	m²	33	331,43	10.937,19	2,00	33,00	-	R\$ 662,86	R\$ 10.937,19	-
1.5.5	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	5	3.341,22	16.706,10	5,00	5,00	-	R\$ 16.706,10	R\$ 16.706,10	-
1.5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 60 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	89,66	11,76	1.054,40		89,66	-	R\$ -	R\$ 1.054,40	0,00
1.5.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	3.919,03	3.919,03		1,00	-	R\$ -	R\$ 3.919,03	-
1.5.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	229,32	4,91	1.125,96	2,63	229,32	-	R\$ 12,91	R\$ 1.125,96	0,00
1.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20	11,28	225,60		20,00	-	R\$ -	R\$ 225,60	-
1.6	ALVENARIA E PINTURA				30.660,73				R\$ 6.981,15	R\$ 30.660,73	0,00
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	76,8	182,53	14.018,30		76,80	-	R\$ -	R\$ 14.018,30	0,00
1.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	153,6	11,10	1.704,96		153,60	-	R\$ -	R\$ 1.704,96	-
1.6.3	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	64,85	124,23	8.056,31		64,85	-	R\$ -	R\$ 8.056,31	0,00
1.6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	76,8	56,80	4.362,24	76,80	76,80	-	R\$ 4.362,24	R\$ 4.362,24	-
1.6.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	76,8	4,95	380,16	76,80	76,80	-	R\$ 380,16	R\$ 380,16	-
1.6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	76,8	21,90	1.681,92	76,80	76,80	-	R\$ 1.681,92	R\$ 1.681,92	-
1.6.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF 05/2021	M	211,5	2,16	456,84	211,50	211,50	-	R\$ 456,84	R\$ 456,84	-
1.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.555,60				R\$ 5.855,60	R\$ 5.855,60	-
1.7.1	Limpeza geral	m²	894	2,87	2.565,78		894,00	-	R\$ 2.565,78	R\$ 2.565,78	-
1.7.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	UN	2	1.644,91	3.289,82	2,00	2,00	-	R\$ 3.289,82	R\$ 3.289,82	-
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA NA FAZENDA BREJINHO				886.485,71				R\$ 58.398,41	R\$ 886.485,71	583.528,20
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				17.862,30				R\$ -	R\$ 17.862,30	0,00
2.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26		6,00	-	R\$ -	R\$ 2.530,26	-
2.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	2424,46	1,52	3.685,17	2.424,46		-	R\$ -	R\$ 3.685,17	0,00
2.1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	1	75,56	75,56		1,00	-	R\$ -	R\$ 75,56	-
2.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51		1,00	-	R\$ -	R\$ 2.014,51	-
2.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	653,56	653,56		1,00	-	R\$ -	R\$ 653,56	-
2.1.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	8	1.112,93	8.903,44		8,00	-	R\$ -	R\$ 8.903,44	-
2.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				217.898,39				R\$ 40.536,91	R\$ 217.898,39	177.270,47
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	181	102,92	18.528,52		181,00	-	R\$ -	R\$ -	18.528,52
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	984,91	95,91	94.462,71		984,91	-	R\$ -	R\$ -	94.462,71



2.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	247,45	97,60	24.170,91		247,45	-		R\$	24.170,91	0,00
2.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF. 05/2016	M	300	54,55	16.365,00		300,00	-	R\$	-	16.365,00	-
2.2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	236,5	60,62	14.336,63		-	236,50	R\$	-	-	14.336,63
2.2.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado.	un	1	1.236,30	1.236,30		-	1,00	R\$	-	-	1.236,30
2.2.7	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 08/2020	m²	84,35	330,37	27.866,70		-	84,35	R\$	-	-	27.866,70
2.2.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	236,5	2,16	510,84		-	236,50	R\$	-	-	510,84
2.2.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	m²	89,09	227,06	20.228,77		-	89,09	R\$	-	-	20.228,77
2.3	EQUIPAMENTOS DE BAIXO				58.491,04		-	-	R\$	-	-	58.491,04
2.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13		-	1,00	R\$	-	-	2.842,13
2.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17		-	1,00	R\$	-	-	7.518,17
2.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50		-	1,00	R\$	-	-	7.915,50
2.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92		-	1,00	R\$	-	-	5.956,92
2.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67		-	1,00	R\$	-	-	6.400,67
2.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	3	3.209,95	9.629,85		-	3,00	R\$	-	-	9.629,85
2.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58		-	1,00	R\$	-	-	4.991,58
2.3.8	INSTALAÇÃO DE LONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40		-	1,00	R\$	-	-	2.913,40
2.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72		-	1,00	R\$	-	-	3.100,72
2.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00		-	2,00	R\$	-	-	4.784,00
2.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10		-	1,00	R\$	-	-	3.438,10
2.4	PARQUE INFANTIL				18.069,53		-	-	R\$	-	-	18.069,53
2.4.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Org Atual e Nova	un	1	1.679,53	1.679,53		-	1,00	R\$	-	-	1.679,53



2.4.2	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada $\phi=1/4"$, sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97	-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.759,97
2.4.3	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.005,51
2.4.4	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.450,55
2.4.5	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m²	1	164,86	164,86	-	1,00	R\$	-	R\$	-	164,86
2.5	PISAPISALMO E ILUMINACAO				11.273,49			R\$	-	R\$	-	11.273,49
2.5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	36	31,40	1.130,40	-	36,00	R\$	-	R\$	-	1.130,40
2.5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4	523,73	2.094,92	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.094,92
2.5.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4	523,73	2.094,92	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.094,92
2.5.4	Planta - Palmeira flânx (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2	207,16	414,32	-	2,00	R\$	-	R\$	-	414,32
2.5.5	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	6	221,36	1.328,16	-	6,00	R\$	-	R\$	-	1.328,16
2.5.6	Fornecimento e plantio de palmeira mini Imperial, média	un	4	107,30	429,20	-	4,00	R\$	-	R\$	-	429,20
2.5.7	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 de Xoulux ou similar, com 8,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	un	26	1.413,38	36.747,88	-	26,00	R\$	-	R\$	-	36.747,88
2.5.8	CADA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	26	209,76	5.453,76	-	26,00	R\$	-	R\$	-	5.453,76
2.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	67,36	10,47	705,25	-	67,36	R\$	-	R\$	-	705,25
2.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	656	4,91	3.220,96	-	656,00			R\$	-	3.220,96
2.5.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	328	21,11	6.924,08	-	328,00	R\$	-	R\$	-	6.924,08
2.5.12	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.341,20	10.729,60	-	8,00	R\$	-	R\$	-	10.729,60
2.6	PARQUE E CASA DE ALVENARIA				24.358,66			R\$	-	R\$	-	24.358,66
2.6.1	FUNDACAO DE BARRAGEM				24.358,66			R\$	-	R\$	-	24.358,66
2.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	1,11	105,17	116,73	1,11	-			R\$	116,73	0,00
2.6.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREJA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	m³	1,11	3.987,20	4.436,89	1,11	-	R\$	-	R\$	4.436,89	0,00
2.6.1.3	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m³	0,43	7.653,06	3.290,81	0,43	-			R\$	3.290,81	0,00
2.6.1.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREJA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	m³	3,13	3.997,20	12.511,23	3,13	-			R\$	12.511,23	0,00
2.6.2	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA				33.610,11			R\$	-	R\$	-	33.610,11
2.6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	67,24	223,71	15.042,26	67,24	-	R\$	-	R\$	15.042,26	0,00
2.6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	134,48	11,10	1.482,72	134,48	-	R\$	-	R\$	1.482,72	0,00
2.6.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	134,48	66,80	7.638,46	134,48	-	R\$	-	R\$	7.638,46	0,00
2.6.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	134,48	4,95	665,67	-	134,48	R\$	-	R\$	-	665,67
2.6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	67,24	33,63	2.261,28	-	67,24	R\$	-	R\$	-	2.261,28
2.6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 11/2016	m²	67,24	21,90	1.472,55	-	67,24	R\$	-	R\$	-	1.472,55
2.6.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	m²	134,48	36,78	4.946,17	-	134,48	R\$	-	R\$	-	4.946,17
2.6.3	FECHADO				24.967,88			R\$	-	R\$	-	24.967,88



2.6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	127,51	130,12	16.691,60	-	127,51	R\$	-	R\$	-	16.591,60
2.6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	127,51	58,90	7.510,33	-	127,51	R\$	-	R\$	-	7.510,33
2.6.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,5	100,70	855,95	-	8,50	R\$	-	R\$	-	855,95
2.6.4	ESQUADRIAS				1.884,28	-		R\$	-	R\$	-	1.884,28
2.6.4.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	471,07	1.884,28	-	4,00	R\$	-	R\$	-	1.884,28
2.6.4.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	798,37	798,37	-	1,00	R\$	-	R\$	-	798,37
2.6.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	m²	12,54	785,35	9.848,28	-	12,54	R\$	-	R\$	-	9.848,28
2.6.4.4	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro	m²	1,44	578,71	833,34	-	1,44	R\$	-	R\$	-	833,34
2.6.5	REDE ELÉTRICA, HIDROSANITÁRIA E TELEFÔNICA				2.453,44	-		R\$	-	R\$	-	2.453,44
2.6.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	613,36	2.453,44	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.453,44
2.6.5.2	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,60x0,60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapié 10 cm, assentada.	un	2	1.640,52	3.681,04	-	2,00	R\$	-	R\$	-	3.681,04
2.6.5.3	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 80 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	740,27	2.961,08	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.961,08
2.6.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27	10,47	282,69	-	27,00	R\$	-	R\$	-	282,69
2.6.5.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	64,41	128,82	-	2,00	R\$	-	R\$	-	128,82
2.6.5.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 PS	UN	2	920,66	1.841,32	-	2,00	R\$	-	R\$	-	1.841,32
2.6.5.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12	48,57	582,84	-	12,00	R\$	-	R\$	-	582,84
2.6.5.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3	203,76	611,28	-	3,00	R\$	-	R\$	-	611,28
2.6.5.9	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	10	224,16	2.241,60	-	10,00	R\$	-	R\$	-	2.241,60
2.6.5.10	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	9	23,52	211,68	-	9,00	R\$	-	R\$	-	211,68
2.6.5.11	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 100MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	4	186,58	746,32	-	4,00	R\$	-	R\$	-	746,32
2.6.5.12	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	4	32,51	130,04	-	4,00	R\$	-	R\$	-	130,04
2.6.5.13	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	2	131,67	263,34	-	2,00	R\$	-	R\$	-	263,34
2.6.5.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	34,81	278,48	-	8,00	R\$	-	R\$	-	278,48



2.6.5.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	1.033,81	2.067,62	-	2,00	R\$	-	R\$	-	2.067,62
2.6.5.16	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2	215,58	431,16	-	2,00	R\$	-	R\$	-	431,16
2.6.6	PISO E REVESTIMENTO				3.868,81	-	3,82	R\$	-	R\$	-	3.868,81
2.6.6.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3,82	1.012,78	3.868,81	-	3,82	R\$	-	R\$	-	3.868,81
2.6.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PFE	m²	52,18	105,73	6.516,99	-	52,18	R\$	-	R\$	-	5.516,99
2.6.6.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,4	107,85	258,84	-	2,40	R\$	-	R\$	-	258,84
2.7	REPOZIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA				148.107,34	-		R\$	-	R\$	-	148.107,34
2.7.1	Lastro de brita graduada aplicada a=10cm	m²	576	40,10	23.097,60	-	576,00	R\$	-	R\$	-	23.097,60
2.7.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	576	3,48	2.004,48	-	576,00	R\$	-	R\$	-	2.004,48
2.7.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	576	148,83	85.438,08	-	576,00	R\$	-	R\$	-	85.438,08
2.7.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360	14,03	5.050,80	-	360,00	R\$	-	R\$	-	5.050,80
2.7.5	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bmg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	m²	200	214,63	42.926,00	-	200,00	R\$	-	R\$	-	42.926,00
2.7.6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	5.241,50	5.241,50	-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.241,50
2.7.7	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	3.819,67	3.819,67	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.819,67
2.7.8	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1	1.227,61	1.227,61	-	1,00	R\$	-	R\$	-	1.227,61
2.7.9	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	301,60	301,60	-	1,00	R\$	-	R\$	-	301,60
2.8	REVESTIMENTO DE PAREDES E LUMINARIAÇÃO				6.952,15	-		R\$	-	R\$	-	6.952,15
2.8.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,89	58,80	1.016,15	-	17,89	R\$	-	R\$	-	1.016,15
2.8.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	75,91	24,36	1.848,40	-	75,91	R\$	-	R\$	-	1.848,40
2.8.3	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12	332,30	3.987,60	-	12,00	R\$	-	R\$	-	3.987,60
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				10.748,02	-		R\$	-	R\$	-	10.748,02
2.9.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2	1.644,91	3.289,82	-	2,00	R\$	-	R\$	-	3.289,82
2.9.2	Limpeza geral	m²	2424,46	2,87	6.958,20	-	2.424,46	R\$	-	R\$	-	6.958,20
3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO POVOADO BANANEIRA (EM FRENTE A UBS)				789.095,09	-		R\$	236.435,06	R\$	600.064,59	108.540,41
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				25.259,86	-		R\$	-	R\$	-	0,00
3.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26	-	6,00	R\$	-	R\$	-	2.530,26
3.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3600,43	1,52	5.472,65	-	3.600,43	R\$	-	R\$	-	5.472,65
3.1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA)	m²	8	841,33	6.730,64	-	8,00	R\$	-	R\$	-	6.730,64
3.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51	-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.014,51
3.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	653,56	653,56	-	1,00	R\$	-	R\$	-	653,56
3.1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	104	75,58	7.858,24	-	104,00	R\$	-	R\$	-	7.858,24
3.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				477.642,91	-		R\$	182.201,13	R\$	434.773,17	42.869,74
3.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	230,73	0,78	179,98	-	230,73	R\$	-	R\$	-	179,98
3.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	897,53	111,37	99.957,91	-	897,53	R\$	-	R\$	-	99.957,91



3.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m²	640,78	127,53	68.965,67		540,78	-	R\$ -	R\$ 68.965,67	-	0,00
3.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	122,28	102,92	12.585,05	122,28	122,28	-	R\$ 12.585,05	R\$ 12.585,05		0,00
3.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1626,7	95,91	156.016,79	1626,7	1.626,70	-	R\$ 156.016,79	R\$ 156.016,79		0,00
3.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	30,35	994,13	30.171,84		30,35	-		R\$ 30.171,84		0,00
3.2.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2023	m²	60,6	227,06	13.759,83	60,6	60,60	-		R\$ 13.759,83		0,00
3.2.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X8,5X8,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2019	M	167,7	54,55	9.148,03		167,70	-	R\$ -	R\$ 9.148,04		0,00
3.2.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	501,3	60,62	30.388,80		501,30	-	R\$ -	R\$ 30.388,80		0,00
3.2.10	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	83,5	513,41	42.869,73		-	83,50	R\$ -	R\$ -		42.869,73
3.2.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desenhado.	un	11	1.236,30	13.599,30	11	11,00	-	R\$ 13.599,30	R\$ 13.599,30		-
3.3	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				59.491,04				R\$ -	R\$ -		59.491,04
3.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13		-	1,00	R\$ -	R\$ -		2.842,13
3.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17		-	1,00	R\$ -	R\$ -		7.518,17
3.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50		-	1,00	R\$ -	R\$ -		7.915,50
3.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92		-	1,00	R\$ -	R\$ -		5.956,92
3.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67		-	1,00	R\$ -	R\$ -		6.400,67
3.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3	3.209,95	9.629,85		-	3,00	R\$ -	R\$ -		9.629,85
3.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58		-	1,00	R\$ -	R\$ -		4.991,58
3.3.8	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40		-	1,00	R\$ -	R\$ -		2.913,40
3.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72		-	1,00	R\$ -	R\$ -		3.100,72
3.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00		-	2,00	R\$ -	R\$ -		4.784,00



3.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10	-	1,00	R\$ -	R\$ -	3.438,10
3.3	PARQUE INFANTIL			12.895,66	12.895,66			R\$ 12.895,66	R\$ 12.895,66	
3.4.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Ataleia Nova	un	1	1.679,63	1.679,63	1	1,00	R\$ 1.679,63	R\$ 1.679,63	-
3.4.2	Escondidoira em madeira c/2,50m de placa (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51	1	1,00	R\$ 3.005,51	R\$ 3.005,51	-
3.4.3	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55	1	1,00	R\$ 3.450,55	R\$ 3.450,55	-
3.4.4	Brinquedo - Gira-gira (carrossel s=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada s=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97	1	1,00	R\$ 4.759,97	R\$ 4.759,97	-
3.5	PAISAGISMO			40.729,21	40.729,21			R\$ 19.169,91	R\$ 40.729,21	-
3.5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	91,85	31,40	2.884,09	91,85	-	R\$ -	R\$ 2.884,09	-
3.5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	5	523,73	2.618,65	5,00	-	R\$ -	R\$ 2.618,65	-
3.5.3	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	8	1.299,03	10.392,24	8,00	-	R\$ -	R\$ 10.392,24	-
3.5.4	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,54	230,82	5.664,32	24,54	-	R\$ -	R\$ 5.664,32	-
3.5.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	m²	57,84	331,43	19.169,91	57,84	-	R\$ 19.169,91	R\$ 19.169,91	-
3.6	ALVENARIA PINTURA			76.073,45	76.073,45			R\$ 11.835,12	R\$ 76.073,45	-
3.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	189,7	182,53	34.625,94	189,70	-	R\$ -	R\$ 34.625,94	-
3.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	379,4	11,10	4.211,34	379,40	-	R\$ -	R\$ 4.211,34	-
3.6.3	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x8x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	31	124,23	3.851,13	31,00	-	R\$ -	R\$ 3.851,13	-
3.6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	379,4	56,80	21.549,92	379,40	-	R\$ -	R\$ 21.549,92	-
3.6.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	379,4	4,95	1.878,03	379,4	-	R\$ 1.878,03	R\$ 1.878,03	-
3.6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2018	m²	379,4	21,90	8.308,86	379,4	-	R\$ 8.308,86	R\$ 8.308,86	-
3.6.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	763,07	2,16	1.648,23	763,07	-	R\$ 1.648,23	R\$ 1.648,23	-
3.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			16.912,87	16.912,87			R\$ 10.333,23	R\$ 10.333,23	-
3.7.1	Limpeza geral	m²	3600,43	2,87	10.333,23	3600,43	-	R\$ 10.333,23	R\$ 10.333,23	-
3.7.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	UN	4	1.644,91	6.579,64	-	4,00	R\$ -	R\$ 6.579,64	-
3.8	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA VARZEA GRANDE			880.141,81	880.141,81			R\$ 16.422,00	R\$ 401.856,51	-
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			22.125,66	22.125,66			R\$ -	R\$ 22.125,66	-
4.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26	6,00	-	R\$ -	R\$ 2.530,26	-
4.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	2833,42	1,52	4.308,79	2.833,42	-	R\$ -	R\$ 4.308,79	-
4.1.3	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CEMENTO E AREIA)	m²	8	841,33	6.730,64	8,00	-	R\$ -	R\$ 6.730,64	-
4.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	77,95	75,58	5.889,90	77,95	-	R\$ -	R\$ 5.889,90	-
4.1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51	1,00	-	R\$ -	R\$ 2.014,51	-
4.1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1	653,56	653,56	1,00	-	R\$ -	R\$ 653,56	-
4.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE			269.379,62	269.379,62			R\$ -	R\$ 229.163,89	-



4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	788,98	95,91	75.479,25		788,98	-	R\$	-	R\$	75.479,25	0,00
4.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	91,61	89,57	8.205,50		91,61	-			R\$	8.205,50	0,00
4.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2020	m²	810,27	111,97	90.239,76		810,27	-			R\$	90.239,76	0,00
4.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	102,98	97,68	10.059,08		102,98	-			R\$	10.059,08	0,00
4.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	7,483	984,13	7.439,07		7,48	-	R\$	-	R\$	7.439,07	0,00
4.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X8,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	91	54,55	4.964,05		91,00	-	R\$	-	R\$	4.964,05	-
4.2.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	196	60,62	11.881,52		196,00	-	R\$	-	R\$	11.881,52	-
4.2.8	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	78,33	513,41	40.215,40		-	78,33	R\$	-	R\$	-	40.215,40
4.2.9	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado.	un	8	1.236,30	9.890,40		8,00	-	R\$	-	R\$	9.890,40	-
4.2.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	48,47	227,06	11.005,59		48,47	-			R\$	11.005,59	0,00
4.3	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				59.491,04				R\$		R\$		59.491,04
4.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13		-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.842,13
4.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17		-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.518,17
4.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50		-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.915,50
4.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92		-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.956,92
4.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67		-	1,00	R\$	-	R\$	-	6.400,67
4.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3	3.209,85	9.629,85		-	3,00	R\$	-	R\$	-	9.629,85
4.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58		-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.991,58
4.3.8	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40		-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.913,40
4.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72		-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.100,72
4.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00		-	2,00	R\$	-	R\$	-	4.784,00



4.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10	-	1,00	R\$ -	R\$ -	3.438,10
4.4	PARQUE INFANTIL			12.895,66	12.895,66	-	-	R\$ 12.895,66	R\$ 25.791,32	R\$ 12.895,66
4.4.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	1	1.679,63	1.679,63	2,00	1,00	R\$ 1.679,63	R\$ 3.359,26	1.679,63
4.4.2	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51	2,00	1,00	R\$ 3.005,51	R\$ 6.011,02	3.005,51
4.4.3	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55	2,00	1,00	R\$ 3.450,55	R\$ 6.901,10	3.450,55
4.4.4	Brinquedo - Gira-gira (carrossel a=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97	2,00	1,00	R\$ 4.759,97	R\$ 9.519,94	4.759,97
4.5	PAISAGISMO			24.249,94	24.249,94	-	-	R\$ -	R\$ 24.249,94	R\$ 0,00
4.5.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	58,9	17,61	1.037,22	58,90	-	R\$ -	R\$ 1.037,22	0,00
4.5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2	523,73	1.047,46	2,00	-	R\$ -	R\$ 1.047,46	-
4.5.3	Banco com encosto, comp=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4	1.341,20	5.364,80	4,00	-	R\$ -	R\$ 5.364,80	-
4.5.4	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peba, h=3m	un	2	1.299,03	2.598,06	2,00	-	R\$ -	R\$ 2.598,06	-
4.5.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	33,45	331,43	11.086,33	33,45	-	R\$ -	R\$ 11.086,33	0,00
4.5.6	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,5	230,82	3.116,07	13,50	-	R\$ -	R\$ 3.116,07	-
4.6	ALVENARIA PINTURA			96.999,36	96.999,36	-	-	R\$ -	R\$ 96.999,36	R\$ 0,00
4.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	259,32	182,53	47.333,67	259,32	-	R\$ -	R\$ 47.333,67	0,00
4.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	518,64	11,10	5.756,90	518,64	-	R\$ -	R\$ 5.756,90	0,00
4.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	518,64	56,80	29.458,75	518,64	-	R\$ -	R\$ 29.458,75	0,00
4.6.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	518,64	4,95	2.567,26	518,64	-	R\$ -	R\$ 2.567,26	0,00
4.6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	518,64	21,90	11.358,21	518,64	-	R\$ -	R\$ 11.358,21	0,00
4.6.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	242,86	2,18	524,57	242,86	-	R\$ -	R\$ 524,57	0,00
4.7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			4.999,73	4.999,73	-	-	R\$ 3.526,34	R\$ 3.526,34	R\$ 1.473,39
4.7.1	Limpeza geral	m²	1228,69	2,87	3.526,34	1228,69	-	R\$ 3.526,34	R\$ 3.526,34	0,00
4.7.2	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vel e vem	un	3	491,13	1.473,39	-	3,00	R\$ -	R\$ -	1.473,39
5	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA FAZENDA BANANEIRA DE CIMA-CÓTIA (EM FRENTE DA IGREJA CATÓLICA)			71.587,82	71.587,82	-	-	R\$ 68.121,70	R\$ 68.121,70	R\$ 3.465,92
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.426,72	1.426,72	-	-	R\$ 1.426,72	R\$ 1.426,72	R\$ -
5.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m³	315	1,52	478,80	315	315,00	R\$ 478,80	R\$ 478,80	-
5.1.2	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (CIMENTO E AREIA)	m²	1	841,33	841,33	1	1,00	R\$ 841,33	R\$ 841,33	-
5.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE			43.248,01	43.248,01	-	-	R\$ 43.248,01	R\$ 43.248,01	R\$ 0,00
5.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	187	111,37	20.826,19	187	187,00	R\$ 20.826,19	R\$ 20.826,19	-
5.2.2	GOLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m³	22,44	164,86	3.699,45	22,44	22,44	R\$ 3.699,45	R\$ 3.699,45	0,00
5.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	80	95,91	7.672,80	80	80,00	R\$ 7.672,80	R\$ 7.672,80	-
5.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	2,78	994,13	2.743,79	2,78	2,78	R\$ 2.743,79	R\$ 2.743,79	0,00



5.2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	71	54,55	3.873,05	71	71,00	-	R\$	3.873,05	R\$	3.873,05	-
5.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	53	60,31	3.196,43	53	53,00	-	R\$	3.196,43	R\$	3.196,43	-
5.2.7	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldado.	un	1	1.236,30	1.236,30	1	1,00	-	R\$	1.236,30	R\$	1.236,30	-
5.3	PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO				8.668,78				R\$	8.668,78	R\$	8.668,78	-
5.3.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	10	17,61	176,10	-	-	10,00	R\$	-	R\$	-	176,10
5.3.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2	523,73	1.047,46	2	2,00	-	R\$	1.047,46	R\$	1.047,46	-
5.3.3	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1608, da Niko ou similar	un	4	680,02	2.720,08	4	4,00	-	R\$	2.720,08	R\$	2.720,08	-
5.3.4	Poste de aço galvanizado cônico conito reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 6m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	2	2.063,66	4.107,12	2	2,00	-	R\$	4.107,12	R\$	4.107,12	-
5.4	ALVENARIA PINTURA				14.774,82				R\$	14.774,82	R\$	14.774,82	-
5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	39	182,63	7.118,67	39	39,00	-	R\$	7.118,67	R\$	7.118,67	-
5.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM GOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	78	11,10	865,80	78	78,00	-	R\$	865,80	R\$	865,80	-
5.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	78	58,90	4.430,40	78	78,00	-	R\$	4.430,40	R\$	4.430,40	-
5.4.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	78	4,95	386,10	78	78,00	-	R\$	386,10	R\$	386,10	-
5.4.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	78	21,90	1.708,20	78	78,00	-	R\$	1.708,20	R\$	1.708,20	-
5.4.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	123	2,16	265,68	123	123,00	-	R\$	265,68	R\$	265,68	-
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				4.193,87				R\$	4.193,87	R\$	4.193,87	-
5.5.1	Limpeza geral	m²	315	2,87	904,05	315	315,00	-	R\$	904,05	R\$	904,05	-
5.5.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2	1.644,91	3.289,82	-	-	2,00	R\$	-	R\$	-	3.289,82
6	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA FAZENDA CAPOEIRA				1.027.874,72				R\$	1.027.874,72	R\$	1.027.874,72	-
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				25.830,42				R\$	25.830,42	R\$	25.830,42	-
6.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26	-	-	6,00	R\$	-	R\$	-	2.530,26
6.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3604,69	1,52	5.479,12	-	-	3.604,69	R\$	-	R\$	-	5.479,12
6.1.3	BARRACO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	9	841,33	6.730,64	-	-	8,00	R\$	-	R\$	-	6.730,64
6.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	M	124,7	75,56	9.422,33	-	-	124,70	R\$	-	R\$	-	9.422,33
6.1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51	-	-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.014,51
6.1.6	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	653,56	653,56	-	-	1,00	R\$	-	R\$	-	653,56
6.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				258.708,17				R\$	258.708,17	R\$	258.708,17	-
6.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	251,4	102,92	25.874,08	-	-	251,40	R\$	-	R\$	-	25.874,08
6.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1389	95,91	133.218,99	-	-	1.389,00	R\$	-	R\$	-	133.218,99



6.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	720,33	111,37	60.223,15	-	720,33	R\$	-	R\$	-	80.223,15
6.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	122,66	97,68	11.981,42	-	122,66	R\$	-	R\$	-	11.981,42
6.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	10,99	994,13	10.925,48	-	10,99	R\$	-	R\$	-	10.925,48
6.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X8,5X8,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	315,47	54,55	17.208,88	-	315,47	R\$	-	R\$	-	17.208,88
6.2.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	137,44	60,62	8.331,61	-	137,44	R\$	-	R\$	-	8.331,61
6.2.8	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado.	un	5	1.239,30	6.181,50	-	5,00	R\$	-	R\$	-	6.181,50
6.2.9	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	m²	164,84	330,37	54.458,19	-	164,84	R\$	-	R\$	-	54.458,19
6.2.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO). AF_05/2021	M	137,44	2,16	296,87	-	137,44	R\$	-	R\$	-	296,87
6.3	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				68.494,84			R\$		R\$		68.494,84
6.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13	-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.842,13
6.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17	-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.518,17
6.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTIXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50	-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.915,50
6.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92	-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.956,92
6.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67	-	1,00	R\$	-	R\$	-	6.400,67
6.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3	3.209,95	9.629,85	-	3,00	R\$	-	R\$	-	9.629,85
6.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58	-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.991,58
6.3.8	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40	-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.913,40
6.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DÚPLA, APARELHO TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.100,72
6.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DÚPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00	-	2,00	R\$	-	R\$	-	4.784,00
6.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DÚPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.438,10



6.4	PARQUE INFANTIL				16.149,40				R\$	R\$	R\$	16.149,40
6.4.1	Brinquedo - Gorrongo em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orto Atalaia Nova	un	1	1.679,63	1.679,63	-	1,00	R\$	-	R\$	-	1.679,63
6.4.2	Brinquedo - Gira-gira (carrossel s=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada s=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97	-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.759,97
6.4.3	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.005,51
6.4.4	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.450,55
6.4.5	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m²	19,7	164,66	3.247,74	-	19,70	R\$	-	R\$	-	3.247,74
6.5	PARQUEAMENTO E ILUMINAÇÃO				66.536,11				R\$	R\$	R\$	66.536,11
6.5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	52,1	31,40	1.635,94	-	52,10	R\$	-	R\$	-	1.635,94
6.5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4	523,73	2.094,92	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.094,92
6.5.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	4	523,73	2.094,92	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.094,92
6.5.4	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	4	207,16	828,64	-	4,00	R\$	-	R\$	-	828,64
6.5.5	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,5	230,82	3.116,07	-	13,50	R\$	-	R\$	-	3.116,07
6.5.6	Banco com encosto, compr=1,60m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 rês de madeira, inclusive pintura	un	4	1.341,20	5.364,80	-	4,00	R\$	-	R\$	-	5.364,80
6.5.7	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	3	2.053,66	6.160,68	-	3,00	R\$	-	R\$	-	6.160,68
6.5.8	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2.6" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2018	UN	6	721,40	4.328,40	-	6,00	R\$	-	R\$	-	4.328,40
6.5.9	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12	332,30	3.987,60	-	12,00	R\$	-	R\$	-	3.987,60
6.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	62,87	7,53	473,41	-	62,87	R\$	-	R\$	-	473,41
6.5.11	Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 250W	un	15	1.413,38	21.200,70	-	15,00	R\$	-	R\$	-	21.200,70
6.5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	87,36	10,47	705,25	-	87,36	R\$	-	R\$	-	705,25
6.5.13	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl.base concreto	un	4	2.423,05	9.692,20	-	4,00	R\$	-	R\$	-	9.692,20
6.5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	123,68	4,91	606,77	-	123,68	R\$	-	R\$	-	606,77
6.5.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	295,87	21,11	6.245,81	-	295,87	R\$	-	R\$	-	6.245,81
6.6	QUADRANTES				196.964,95				R\$	R\$	R\$	196.964,95
6.6.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				18.159,63				R\$	R\$	R\$	18.159,63
6.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	2,22	105,17	233,47	-	2,22	R\$	-	R\$	-	233,47
6.6.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPa. AF. 11/2022	m³	1,66	3.997,20	6.635,35	-	1,66	R\$	-	R\$	-	6.635,35
6.6.1.3	Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelim ou madeira de lei	m³	0,43	7.653,06	3.290,81	-	0,43	R\$	-	R\$	-	3.290,81
6.6.2	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA				61.754,08				R\$	R\$	R\$	61.754,08
6.6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	163,96	223,71	36.679,49	-	163,96	R\$	-	R\$	-	36.679,49
6.6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	327,92	11,10	3.639,91	-	327,92	R\$	-	R\$	-	3.639,91
6.6.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	327,92	56,80	18.625,85	-	327,92	R\$	-	R\$	-	18.625,85
6.6.2.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	327,92	4,95	1.623,20	-	327,92	R\$	-	R\$	-	1.623,20



6.6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF. 11/2016	m²	163,96	33,63	5.513,97	-	163,96	R\$	-	R\$	-	5.513,97
6.6.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF. 11/2016	m²	163,96	21,90	3.590,72	-	163,96	R\$	-	R\$	-	3.590,72
6.6.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	m²	327,92	36,78	12.060,89	-	327,92	R\$	-	R\$	-	12.060,89
6.6.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	127,51	130,12	16.591,60	-	127,51	R\$	-	R\$	-	16.591,60
6.6.3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	127,51	58,90	7.510,33	-	127,51	R\$	-	R\$	-	7.510,33
6.6.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	17	100,70	1.711,90	-	17,00	R\$	-	R\$	-	1.711,90
6.6.4.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4	475,01	1.900,04	-	4,00	R\$	-	R\$	-	1.900,04
6.6.4.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2	798,37	1.596,74	-	2,00	R\$	-	R\$	-	1.596,74
6.6.4.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021. PS	m²	12,54	785,35	9.848,28	-	12,54	R\$	-	R\$	-	9.848,28
6.6.4.4	Baculante em alumínio, cor N°18, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusivo vidro	m²	1,44	578,71	833,34	-	1,44	R\$	-	R\$	-	833,34
6.6.5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	613,36	2.453,44	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.453,44
6.6.5.2	Placa de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,60x0,60, com 01 cuba de aço inox, alça cromada, válvula cromada, torneira em aço inox. Inclusive rodapé 10 cm, assentada.	un	2	1.840,52	3.681,04	-	2,00	R\$	-	R\$	-	3.681,04
6.6.5.3	BANCADA GRANITO CINZA, 60 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4	740,27	2.961,08	-	4,00	R\$	-	R\$	-	2.961,08
6.6.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	69,6	3,42	238,03	-	69,60	R\$	-	R\$	-	238,03
6.6.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	50	4,91	245,50	-	50,00	R\$	-	R\$	-	245,50
6.6.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	22	10,47	230,34	-	22,00	R\$	-	R\$	-	230,34
6.6.5.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8	54,42	435,36	-	8,00	R\$	-	R\$	-	435,36
6.6.5.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8	56,60	452,80	-	8,00	R\$	-	R\$	-	452,80
6.6.5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4	35,02	140,08	-	4,00	R\$	-	R\$	-	140,08
6.6.5.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2	53,12	106,24	-	2,00	R\$	-	R\$	-	106,24
6.6.5.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	64,41	128,82	-	2,00	R\$	-	R\$	-	128,82
6.6.6.12	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 60A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF. 07/2020. PS	UN	2	920,66	1.841,32	-	2,00	R\$	-	R\$	-	1.841,32
6.6.6.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	59,8	13,28	794,14	-	59,80	R\$	-	R\$	-	794,14
6.6.6.14	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	12	48,57	582,84	-	12,00	R\$	-	R\$	-	582,84



6.6.5.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	28	209,76	5.453,76	-	28,00	R\$	-	R\$	-	5.453,76
6.6.5.16	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pl/ esgoto predial, d = 40 mm	m	14,6	23,52	343,39	-	14,60	R\$	-	R\$	-	343,39
6.6.5.17	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pl/ esgoto predial, d = 50 mm	m	7,7	32,51	250,32	-	7,70	R\$	-	R\$	-	250,32
6.6.5.18	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa pl/ esgoto predial, d = 100 mm	m	34,7	55,02	1.909,19	-	34,70	R\$	-	R\$	-	1.909,19
6.6.5.19	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, pl/ esgoto e águas pluviais, d= 75mm	m	16,5	59,76	985,87	-	16,50	R\$	-	R\$	-	985,87
6.6.5.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8	34,81	278,48	-	8,00	R\$	-	R\$	-	278,48
6.6.5.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2	1.033,81	2.067,62	-	2,00	R\$	-	R\$	-	2.067,62
6.6.5.22	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	UN	2	215,58	431,16	-	2,00	R\$	-	R\$	-	431,16
6.6.6	PISO E REVESTIMENTO				23.067,84	-		R\$	-	R\$	-	23.067,84
6.6.6.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	m²	7,65	1.012,78	7.747,76	-	7,65	R\$	-	R\$	-	7.747,76
6.6.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	m²	140	105,73	14.802,20	-	140,00	R\$	-	R\$	-	14.802,20
6.6.6.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 08/2020	M	4,8	107,85	517,68	-	4,80	R\$	-	R\$	-	517,68
6.7	QUADRA POLIESPORTIVA				283.377,84	-		R\$	-	R\$	-	283.377,84
6.7.1	Lastro de brita graduada aplicada e=10cm	m²	576	40,10	23.097,60	-	576,00	R\$	-	R\$	-	23.097,60
6.7.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	m²	576	3,48	2.004,48	-	576,00	R\$	-	R\$	-	2.004,48
6.7.3	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF. 04/2022	m²	576	148,33	85.438,08	-	576,00	R\$	-	R\$	-	85.438,08
6.7.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	m²	600	281,68	168.996,00	-	600,00	R\$	-	R\$	-	168.996,00
6.7.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	360	14,03	5.050,80	-	360,00	R\$	-	R\$	-	5.050,80
6.7.6	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	5.241,50	5.241,50	-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.241,50
6.7.7	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	1	3.819,67	3.819,67	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.819,67
6.7.8	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/escudador e catraca	par	1	1.227,61	1.227,61	-	1,00	R\$	-	R\$	-	1.227,61
6.7.9	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	301,60	301,60	-	1,00	R\$	-	R\$	-	301,60
6.8	MURETA DA QUADRA				32.841,80	-		R\$	-	R\$	-	32.841,80
6.8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m³	60	182,53	10.951,80	-	60,00	R\$	-	R\$	-	10.951,80
6.8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	139	11,10	1.542,90	-	139,00	R\$	-	R\$	-	1.542,90
6.8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	139	56,80	7.895,20	-	139,00	R\$	-	R\$	-	7.895,20
6.8.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	m³	3,75	3.107,10	11.651,62	-	3,75	R\$	-	R\$	-	11.651,62
6.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				11.899,37	-		R\$	-	R\$	-	11.899,37
6.9.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	1	1.644,91	1.644,91	-	1,00	R\$	-	R\$	-	1.644,91
6.9.2	Limpeza geral	m³	3604,69	2,87	10.345,46	-	3.604,69	R\$	-	R\$	-	10.345,46
7	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA FAZENDA CALUMBI				471.735,19	-		R\$	82.579,15	R\$	401.975,95	69.759,23
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				17.828,08	-		R\$	-	R\$	17.926,09	



7.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26	6,00	-	R\$	-	R\$	2.530,26	-
7.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2516	1,52	3.824,32	2.516,00	-	R\$	-	R\$	3.824,32	-
7.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	8	1.112,93	8.903,44	8,00	-	R\$	-	R\$	8.903,44	-
7.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51	1,00	-	R\$	-	R\$	2.014,51	-
7.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	653,56	653,56	1,00	-	R\$	-	R\$	653,56	-
7.2	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE				274.789,44			R\$	-	R\$	268.457,26	R\$ 10.268,20
7.2.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	250	0,78	195,00	250,00	-	R\$	-	R\$	195,00	-
7.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	412,6	60,62	25.011,81	412,60	-	R\$	-	R\$	25.011,81	0,00
7.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 38X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	28,88	54,55	1.466,30	28,88	-	R\$	-	R\$	1.466,30	0,00
7.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1307	111,37	145.560,59	1.307,00	-	R\$	-	R\$	145.560,59	-
7.2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	183	102,92	18.834,36	183,00	-	R\$	-	R\$	18.834,36	-
7.2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	256	95,91	24.552,96	256,00	-	R\$	-	R\$	24.552,96	-
7.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	38,22	994,13	37.995,64	38,22	-	R\$	-	R\$	37.995,64	0,00
7.2.8	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	20	513,41	10.268,20	-	20,00	R\$	-	R\$	-	10.268,20
7.2.9	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmado.	un	12	1.236,30	14.835,60	12,00	-	R\$	-	R\$	14.835,60	-
7.3	EQUIPAMENTOS DE LADO				59.491,04			R\$	-	R\$	59.491,04	
7.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13	-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.842,13
7.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17	-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.518,17
7.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50	-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.915,50
7.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92	-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.956,92
7.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67	-	1,00	R\$	-	R\$	-	6.400,67
7.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	3	3.209,95	9.629,85	-	3,00	R\$	-	R\$	-	9.629,85
7.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58	-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.991,58



7.3.8	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40	-	1,00	R\$ -	R\$ -	2.913,40
7.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72	-	1,00	R\$ -	R\$ -	3.100,72
7.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00	-	2,00	R\$ -	R\$ -	4.784,00
7.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF 10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10	-	1,00	R\$ -	R\$ -	3.438,10
7.4	PARQUE INFANTIL				14.879,96			R\$ 14.879,96	R\$ 14.879,96	
7.4.1	Brinquedo - Gongoira em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1	1.679,63	1.679,63	1	1,00	R\$ 1.679,63	R\$ 1.679,63	-
7.4.2	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m²	12	184,86	1.978,32	12	12,00	R\$ 1.978,32	R\$ 1.978,32	-
7.4.3	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51	1	1,00	R\$ 3.005,51	R\$ 3.005,51	-
7.4.4	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55	1	1,00	R\$ 3.450,55	R\$ 3.450,55	-
7.4.5	Brinquedo - Gira-gira (carrossel s=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada s=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97	1	1,00	R\$ 4.759,97	R\$ 4.759,97	-
7.5	PARQUEAMENTO E ILUMINAÇÃO				59.384,02			R\$ 59.384,02	R\$ 59.384,02	0,00
7.5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	28	31,40	879,20	28	28,00	R\$ 879,20	R\$ 879,20	-
7.5.2	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3	105,61	316,83	3	3,00	R\$ 316,83	R\$ 316,83	-
7.5.3	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	un	2	58,20	116,40	2	2,00	R\$ 116,40	R\$ 116,40	-
7.5.4	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	7	680,02	4.760,14		7,00	R\$ -	R\$ 4.760,14	-
7.5.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	m²	27	331,43	8.948,61		27,00	R\$ -	R\$ 8.948,61	-
7.5.6	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 80mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	2	2.053,56	4.107,12	2	2,00	R\$ 4.107,12	R\$ 4.107,12	-
7.5.7	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	11	3.341,22	36.753,42	11	11,00	R\$ 36.753,42	R\$ 36.753,42	-
7.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	100,3	11,78	1.179,52		100,30	R\$ -	R\$ 1.179,52	0,00
7.5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	100,3	11,28	1.131,38		100,30	R\$ -	R\$ 1.131,38	0,00
7.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	200,6	5,47	1.097,28		200,60	R\$ -	R\$ 1.097,28	0,00
7.5.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	92,02	92,02		1,00	R\$ -	R\$ 92,02	-
7.6	ALVENARIA E PINTURA				22.886,61			R\$ 6.798,92	R\$ 22.886,61	
7.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	m²	70,6	182,53	12.886,61		70,60	R\$ -	R\$ 12.886,61	0,00
7.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	70,6	11,10	783,66		70,60	R\$ -	R\$ 783,66	-
7.6.3	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singles), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	17,22	124,23	2.139,24		17,22	R\$ -	R\$ 2.139,24	0,00
7.6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 08/2014	m²	70,6	56,80	4.010,08		70,60	R\$ 4.010,08	R\$ 4.010,08	-
7.6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	m²	70,6	21,90	1.546,14		70,60	R\$ 1.546,14	R\$ 1.546,14	-



7.6.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	412,6	2,16	891,21	412,6	412,60	-	R\$ 891,21	R\$ 891,21	0,00
7.6.7	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	70,6	4,95	349,47	70,6	70,60	-	R\$ 349,47	R\$ 349,47	-
7.7	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				18.735,29				R\$ 18.735,29	R\$ 18.735,29	-
7.7.1	Limpeza geral	m²	2516	2,87	7.220,82	2516	2.516,00	-	R\$ 7.220,92	R\$ 7.220,92	-
7.7.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	7	1.844,91	11.514,37	7	7,00	-	R\$ 11.514,37	R\$ 11.514,37	-
8	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FAZENDA LINHA VERDE				432.845,11				R\$ 187.148,63	R\$ 325.775,21	R\$ 106.769,83
8.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				21.897,48				R\$ 21.067,48	R\$ 21.067,48	-
8.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	421,71	2.530,26		6,00	-	R\$ -	R\$ 2.530,26	-
8.1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1798,72	1,52	2.734,05		1.798,72	-	R\$ -	R\$ 2.734,05	- 0,00
8.1.3	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	8	641,33	5.730,64		8,00	-	R\$ -	R\$ 6.730,64	-
8.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	84,76	75,56	6.404,46		84,76	-	R\$ -	R\$ 6.404,46	- 0,00
8.1.5	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	653,56	653,56		1,00	-	R\$ -	R\$ 653,56	-
8.1.6	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	2.014,51	2.014,51		1,00	-	R\$ -	R\$ 2.014,51	-
8.2	PAVIMENTAÇÃO E ASSESSALIDADE				271.234,86				R\$ 146.991,86	R\$ 227.245,76	R\$ 43.988,96
8.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	91,61	102,92	9.428,50	91,61	91,61	-	R\$ 9.428,50	R\$ 9.428,50	- 0,00
8.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	1161,5	95,91	111.399,46	1161,5	1.161,50	-	R\$ 111.399,47	R\$ 111.399,47	- 0,00
8.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X3,5X3,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	54,76	54,55	2.987,15		54,76	-	R\$ -	R\$ 2.987,15	- 0,00
8.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	212,5	60,82	12.881,75		212,50	-	R\$ -	R\$ 12.881,75	-
8.2.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	358,8	127,53	45.757,76		358,80	-	R\$ -	R\$ 45.757,76	- 0,00
8.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	247,95	97,68	24.219,75	57,35	247,95	-	R\$ 5.601,95	R\$ 24.219,75	- 0,00
8.2.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	6,85	994,13	6.809,79	6,85	6,85	-	R\$ 6.809,79	R\$ 6.809,79	- 0,00
8.2.8	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	85,68	513,41	43.988,96		-	85,68	-R\$ 0,01	-R\$ 0,01	- 43.988,97
8.2.9	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontado.	un	5	1.236,30	6.181,50	5	5,00	-	R\$ 6.181,50	R\$ 6.181,50	-
8.2.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	33,34	227,06	7.570,18	33,34	33,34	-	R\$ 7.570,18	R\$ 7.570,18	- 0,00
8.3	EQUIPAMENTOS DE SAÚDE				59.491,04				R\$ -	R\$ -	R\$ 59.491,04
8.3.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	2.842,13	2.842,13		-	1,00	R\$ -	R\$ -	- 2.842,13
8.3.2	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.518,17	7.518,17		-	1,00	R\$ -	R\$ -	- 7.518,17



8.3.3	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	7.915,50	7.915,50	-	1,00	R\$	-	R\$	-	7.915,50
8.3.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	5.956,92	5.956,92	-	1,00	R\$	-	R\$	-	5.956,92
8.3.5	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1	6.400,67	6.400,67	-	1,00	R\$	-	R\$	-	6.400,67
8.3.6	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	3	3.209,95	9.629,85	-	3,00	R\$	-	R\$	-	9.629,85
8.3.7	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	4.991,58	4.991,58	-	1,00	R\$	-	R\$	-	4.991,58
8.3.8	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	2.913,40	2.913,40	-	1,00	R\$	-	R\$	-	2.913,40
8.3.9	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	3.100,72	3.100,72	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.100,72
8.3.10	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	2	2.392,00	4.784,00	-	2,00	R\$	-	R\$	-	4.784,00
8.3.11	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF. 10/2021	UN	1	3.438,10	3.438,10	-	1,00	R\$	-	R\$	-	3.438,10
8.4	PAREDE DE ALVENARIA				12.895,66			R\$	12.895,66	R\$	12.895,66	
8.4.1	Brinquedo - Gançorre em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1	1.679,63	1.679,63	-	1,00	R\$	1.679,63	R\$	1.679,63	-
8.4.2	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	3.005,51	3.005,51	-	1,00	R\$	3.005,51	R\$	3.005,51	-
8.4.3	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.450,55	3.450,55	-	1,00	R\$	3.450,55	R\$	3.450,55	-
8.4.4	Brinquedo - Gira-gira (carrossel e=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.759,97	4.759,97	-	1,00	R\$	4.759,97	R\$	4.759,97	-
8.5	PLANTIO DE GRAMA				26.412,39			R\$	16.967,97	R\$	26.412,39	0,00
8.5.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m²	97,24	17,81	1.712,39	97,24	97,24	-	R\$	1.712,39	R\$	1.712,39
8.5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018	UN	3	523,73	1.571,19	-	3,00	R\$	1.571,19	R\$	1.571,19	-
8.5.3	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4	1.341,20	5.364,80	-	4,00	R\$	-	R\$	5.364,80	-
8.5.4	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	2	1.290,09	2.598,06	-	2,00	R\$	2.598,06	R\$	2.598,06	-
8.5.5	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x357mm, ref. NK1606, da Niko ou similar	un	6	680,02	4.080,12	-	6,00	R\$	-	R\$	4.080,12	-
8.5.6	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	m²	33,45	331,43	11.086,33	33,45	33,45	-	R\$	11.086,33	R\$	11.086,33
8.6	ALVENARIA PINTURA				15.980,50			R\$	5.131,51	R\$	15.980,50	0,00
8.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	87,55	182,53	15.980,50	-	87,55	-	R\$	-	R\$	15.980,50
8.6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	175,1	11,10	1.943,61	-	175,10	-	R\$	-	R\$	1.943,61
8.6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECESAMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	m²	175,1	68,80	9.945,68	-	175,10	-	R\$	-	R\$	9.945,68



9.6.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF. 05/2021	M	174,77	2,16	377,50		174,77	-	R\$ -	R\$ 377,50	-	0,00
9.7	SERV. COMPLEMENTARES				1.449,28				R\$ 4.659,44	R\$ 4.659,44		3.289,82
9.7.1	Limpeza geral	m²	1623,5	2,87	4.659,44	1623,5	1.623,50	-	R\$ 4.659,44	R\$ 4.659,44		0,00
9.7.2	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	2	1.644,91	3.289,82		-	2,00	R\$ -	R\$ -		3.289,82
TOTAL					4519228,48				R\$ 657.739,17	R\$ 2.394.574,48	R\$ 2.124.654,00	

Anderson Santos Lima
MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.184.138/0001-03
ANDERSON SANTOS FIRMO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA N° 3000113306BA

Maianne A. Silva
MAIANNE MACEDO SILVA
SECRETÁRIA DE OBRAS
CREA BA N° 3000118028BA

Data da consulta: 16/08/2024 16:45:39



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.184.136/0001-03**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2023**

Situação no SIMEI: **NAO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



secretaria obras <secobrascipo1@gmail.com>



MUNICIPIO DE CIPO - Liberação 3ª Parcela - Infraestrutura

2 mensagens

Barbara Caroline S B Sacramento <bsacramento@desenbahia.ba.gov.br>
Para: "marquesvereador@hotmail.com" <marquesvereador@hotmail.com>, "teca.moreira@hotmail.com" <teca.moreira@hotmail.com>, "secobrascipo1@gmail.com" <secobrascipo1@gmail.com>
Cc: Sergio Luiz Matos da Silva <ssilva@desenbahia.ba.gov.br>, Nailton Suzarte Ribeiro <nsribeiro@desenbahia.ba.gov.br>, Correio Municipios <municipios@desenbahia.ba.gov.br>, UEF - Desenbahia <ueflocal@desenbahia.ba.gov.br>, Marcelo Borges Weckerle <mweckerle@desenbahia.ba.gov.br>, Everton Freire de Carvalho <ecarvalho@desenbahia.ba.gov.br>

19 de agosto de 2024 às 12:02

Prezados, boa tarde!

Agradecendo o atendimento das condições estabelecidas para o financiamento na linha Infraestrutura do MUNICIPIO DE CIPO, informamos a liberação da segunda parcela dos recursos na forma abaixo:

Liberação – 3ª Parcela

Contrato: 00542023322501

Data prevista para a liberação: será informada posteriormente pelo nosso financeiro

Valor bruto da liberação: R\$ 657.739,17, sendo:

Discriminação	Valor
Construção da praça Berta Veloso	R\$ 17.555,10
Construção da praça em frente à Igreja Católica	R\$ 68.121,70
Construção da praça em frente a UBS	R\$ 236.435,06
Construção da praça Fazenda Calumbi	R\$ 82.579,14
Construção da praça Fazenda Tamanduá	R\$ 49.477,55
Construção da praça Fazenda Capoeira	R\$ -
Construção da praça Várzea Grande	R\$ 16.422,00
Construção da praça Linha Verde	R\$ 187.148,64
Reforma e ampliação da praça de Brejinho	R\$ -
Total	R\$ 657.739,19

*Salientamos que a nota fiscal foi emitida em valor a menor de R\$ 0,02 quando comparado ao Boletim de Medição obtido em nossa inspeção física. Esta diferença deverá ser ajustada no saque posterior.

Dados bancários para crédito:

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	CEP	Banco	Agência-DV	Conta-DV
13.808.936/0001-95	MUNICIPIO DE CIPO	48.450-000	1 - BANCO DO BRASIL S/A	3716-8	24378-7

Oportunamente, nosso financeiro confirmará a data da liberação do crédito.
Ficamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Barbara Caroline Sacramento | bsacramento@desenbahia.ba.gov.br



Edmundo Ferreira da Silva Filho <edmundo@desenbahia.ba.gov.br>

21 de agosto de 2024 às 11:58

Para: Barbara Caroline S B Sacramento <bsacramento@desenbahia.ba.gov.br>, "marquesvereador@hotmail.com" <marquesvereador@hotmail.com>, "teca.moreira@hotmail.com" <teca.moreira@hotmail.com>, "secobrascipo1@gmail.com" <secobrascipo1@gmail.com>

Cc: Sergio Luiz Matos da Silva <ssilva@desenbahia.ba.gov.br>, Nailton Suzarte Ribeiro <nsribeiro@desenbahia.ba.gov.br>, Correlato Municipios <municipios@desenbahia.ba.gov.br>, UEF - Desenbahia <uef@desenbahia.ba.gov.br>, Marcelo Borges Weckerle <mweckerle@desenbahia.ba.gov.br>, Everton Freire de Carvalho <ecarvalho@desenbahia.ba.gov.br>

Bom dia!

Prezados, segue comprovante de pagamento em anexo.

Atenciosamente,

Edmundo Ferreira da Silva Filho | edmundo@desenbahia.ba.gov.br

Técnico

Unidade de Execução Financeira - UEF | (71) 3103-1276

Fax. (71) 3106-1116



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comprovante - MUNICIPIO DE CPO - R\$ 657.739,17 - 20.08.24.pdf
82K



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 14.184.136/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:40 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2024.

Código de controle da certidão: **E35A.3E4C:5405.82A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.184.136/0001-03

Certidão nº: 51639198/2024

Expedição: 25/07/2024, às 12:10:28

Validade: 21/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MONAKO SERVICOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.184.136/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.184.136/0001-03
Razão Social: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA BARAO DE JEREMOABO 69 CASA SALA 03 / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081702142035424504

Informação obtida em 19/08/2024 14:32:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20243153917

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	14.184.136/0001-03

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
CNPJ: 14.232.086/0001-92
Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
CEP: 48.760.000 Telefone: (75) 3266-3076



Processo: 24334e24 - Doc: 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a375-8188116927

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 119593/2024

Contribuinte: MONAKO SERVICOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.184.136/0001-03
Inscrição Municipal: 378627
Endereço: AVENIDA MARIA PINHO, 84 - COQUEIRO CEP.: 48.760-000 ARACI-BA


CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Emissão: 01/07/2024
Validade: 30/08/2024

Atenção!

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Autenticação 192265894443



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.

Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.




Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida conforme o modelo definida pela Prefeitura Municipal de Araci.


RESSALVAS:


Existe(m) lançamento(s) com suspensão administrativa.



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 01 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 01		DATA: 01 08 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☒	Sábado ☐	Domingo ☐
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº: 02			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 03 06 24			
		☒ Segunda-feira ☐ Terça-feira ☐ Quarta-feira ☐ Quinta-feira ☐ Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
CALCETEIRO	05			05	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
TOPOGRAFO					BETONEIRA				
ENCANADOR					RETROESCAVADEIRA				
ELETRICISTA					CAÇAMBA				
CARPINTEIRO									
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº: 03			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 04 06 24			
		Segunda-feira ☒ Terça-feira ☐ Quarta-feira ☐ Quinta-feira ☐ Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo ☐							
CONTRATADA:		MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO Nº:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEOIREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:	07:00	às	12:00	e	14:00	às	17:00	SÁBADO:	às
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
Anderson Santos Lima MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 1360001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					Dernival Dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
Dernival Dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					Anderson Santos Lima MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 1360001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				




CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01		
		OBJETO:				FOLHA Nº: 04		
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 05 08 24		
		Segunda-feira Terça-feira X Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo						
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS						
CONTRATO N.º:		020/2024						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/08/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:		
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x		
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x		
APONTADOR	01			01	NOITE			
PEDREIRO					ACIDENTES			
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.
PINTOR								
AJUDANTE PRÁTICO								
BETONEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS			
SEVENTE	05			05	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	
CALCETEIRO	05			05	BETONEIRA			
TOPOGRAFO					RETROESCAVADEIRA			
ENCANADOR					CAÇAMBA			
ELETRICISTA								
CARPINTEIRO								
VIGIA DIURNO								
ARMADOR								
OPERADOR								
JARDINEIRO								
TOTAL	13			13	TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO								
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às		
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)			
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE								
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO			
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA			



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº: 05			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 06 06 24			
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	X Quinta-feira	Sexta-feira	☐ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
CALCETEIRO	05			05	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
TOPOGRAFO					BETONEIRA				
ENCANADOR					RETROESCAVADEIRA				
ELETRICISTA					CAÇAMBA				
CARPINTEIRO									
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				






CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 06			
						DATA: 07 06 24			
		Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira ☒ Sexta-feira Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
SEVENTE	05			05	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
CALCETEIRO	05			05	BETONEIRA				
TOPOGRAFO					RETROESCAVADEIRA				
ENCANADOR					CAÇAMBA				
ELETRICISTA									
CARPINTEIRO									
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX :		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO :		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001 03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001 03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				




CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº: 07			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 08 06 24			
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☒	Sábado ☐	Domingo ☐
CONTRATADA:		MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
CALCETEIRO	05			05	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
TOPOGRAFO					BETONEIRA				
ENCANADOR					RETROESCAVADEIRA				
ELETRICISTA					CAÇAMBA				
CARPINTEIRO									
VIÇIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01							
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 08		DATA: 10 06 24									
☒ Segunda-feira		☐ Terça-feira		☐ Quarta-feira		☐ Quinta-feira		☐ Sexta-feira		☐ Sábado		☐ Domingo	
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS													
CONTRATO N.º: 020/2024													
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:							
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS							
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE					
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X							
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X							
APONTADOR	01			01	NOITE								
PEDREIRO					ACIDENTES								
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.					
PINTOR													
AJUDANTE PRÁTICO													
BETONEIRO													
SEVENTÊ	05			05									
CALCETEIRO	05			05									
TOPOGRAFO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS								
ENCANADOR					DESCRIÇÃO				QUANTIDADE				
ELETRICISTA					BETONEIRA								
CARPINTEIRO					RETROESCAVADEIRA								
VIGIA DIURNO					CAÇAMBA								
ARMADOR													
OPERADOR													
JARDINEIRO													
TOTAL	13			13					TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO													
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às							
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)							SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)						
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE													
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA							 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO							 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01				
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 09		DATA: 11 06 24						
		Segunda-feira ☒		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☐	Sábado ☐	Domingo	
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS										
CONTRATO N.º: 020/2024										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:				
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS					
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE		
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x				
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x				
APONTADOR	01			01	NOITE					
PEDREIRO					ACIDENTES					
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR										
AJUDANTE PRÁTICO										
BETONEIRO										
SEVENTE	05			05						
CALCETEIRO	05			05						
					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS					
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA					
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA					
CARPINTEIRO					CAÇAMBA					
VIGIA DIURNO										
ARMADOR										
OPERADOR										
JARDINEIRO										
TOTAL	13			13			TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO										
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às				
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)					
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE										
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01						
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 10		DATA: 12 06 24								
		Segunda-feira		Terça-feira	X	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☐	Sábado	☐	Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS										
CONTRATO N.º:		020/2024										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:						
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS							
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE				
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X						
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X						
APONTADOR	01			01	NOITE							
PEDREIRO					ACIDENTES							
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.				
PINTOR												
AJUDANTE PRÁTICO												
BETONEIRO												
SEVENTE	05			05								
CAÇATEIRO	05			05								
TOPOGRAFO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS							
ENCANADOR					DESCRIÇÃO				QUANTIDADE			
ELETRICISTA					BETONEIRA							
CARPINTEIRO					RETROESCAVADEIRA							
VIGIA DIURNO					CAÇAMBA							
ARMADOR												
OPERADOR												
JARDINEIRO												
TOTAL	13			13					TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO												
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às						
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)						
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE												
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 138/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 138/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01						
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 11		DATA: 13 06 24								
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	X	Quinta-feira	Sexta-feira	☐	Sábado	☐	Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS										
CONTRATO N.º:		020/2024										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:						
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS							
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE				
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x						
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x						
APONTADOR	01			01	NOITE							
PEDREIRO					ACIDENTES							
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.				
PINTOR												
AJUDANTE PRÁTICO												
BETONEIRO												
SEVENTE	05			05								
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS							
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO				QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA							
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA							
CARPINTEIRO					CAÇAMBA							
VIGIA DIURNO												
ARMADOR												
OPERADOR												
JARDINEIRO												
TOTAL	13			13	TOTAL							
HORÁRIO DE TRABALHO												
SEG. A SEX.:	07:00	às	12:00	e	14:00	às	17:00	SÁBADO:		às		
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)						
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE												
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 12			
						DATA: 14 08 24			
		Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira ☒ Sexta-feira Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	05			05					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 1360001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 1360001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 13		DATA: 15 06 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☒ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA:		MÓNAGO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
E F E T I V O					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	05			05					
CALETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX :		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO :		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MÓNAGO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MÓNAGO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				





CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA		VOLUME Nº: boletim 03 lote 01	
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 14	
				DATA: 17 06 24	
		☒ Segunda-feira		☐ Terça-feira	☐ Quarta-feira
		☐ Quinta-feira		☐ Sexta-feira	☐ Sábado
		☐ Domingo			
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS					
CONTRATO N.º: 020/2024					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014	
		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	CONDICÕES ATMOSFÉRICAS
ENGENHEIRO	01			01	TEMPO MANHÃ ☒ NORMAL ☒ CHUVA FRACA ☐ CHUVA FORTE ☐
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE ☒
APONTADOR	01			01	NOITE ☐
PEDREIRO					ACIDENTES
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE
PINTOR					C. AFAST.
AJUDANTE PRÁTICO					S. AFAST.
BETONEIRO					
SEVENTE	05			05	
CALCETEIRO	05			05	
TOPOGRAFO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS
ENCANADOR					DESCRIÇÃO
ELETRICISTA					BETONEIRA
CARPINTEIRO					RETROSCAVADEIRA
VIGIA DIURNO					CAÇAMBA
ARMADOR					
OPERADOR					
JARDINEIRO					
TOTAL	13			13	TOTAL
HORÁRIO DE TRABALHO					
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO: às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)			SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)		
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.138/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA N.º 30001133068A EMPRESA			 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO		
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO			 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.138/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA N.º 30001133068A EMPRESA		



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01		
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 15		
						DATA: 18 06 24		
		Segunda-feira ☒ Terça-feira ☐ Quarta-feira ☐ Quinta-feira ☐ Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo ☐						
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS						
CONTRATO N.º:		020/2024						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:		
EFETIVO				CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x		
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x		
APONTADOR	01			01	NOITE			
PEDREIRO					ACIDENTES			
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.
PINTOR								
AJUDANTE PRÁTICO								
BETONEIRO								
SEVENTE	05			05				
CALCETEIRO	05			05				
TOPOGRAFO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS			
ENCANADOR					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	
ELETRICISTA					BETONEIRA			
CARPINTEIRO					RETROESCAVADEIRA			
VIGIA DIURNO					CAÇAMBA			
ARMADOR								
OPERADOR								
JARDINEIRO								
TOTAL	13			13	TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO								
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às		
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)			
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE								
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113308BA EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO			
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113308BA EMPRESA			





CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01		
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 16		
		Segunda-feiraTerça-feiraXQuarta-feiraQuinta-feiraSexta-feiraSábadoDomingo				DATA: 19 06 24		
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS						
CONTRATO N.º:		020/2024						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:		
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x		
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x		
APONTADOR	01			01	NOITE			
PEDEIREIRO					ACIDENTES			
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.
PINTOR								
AJUDANTE PRÁTICO								
BETONEIRO								
BEVENTE	05			05				
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS			
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	
ENCANADOR					BETONEIRA			
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA			
CARPINTEIRO					CAÇAMBA			
VIGIA DIURNO								
ARMADOR								
OPERADOR								
JARDINEIRO								
TOTAL	13			13			TOTAL	
HORÁRIO DE TRABALHO								
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às		
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)			
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE								
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.130/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO			
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.130/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA			




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: FOLHA Nº: 17		boletim 01 lote 01	
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	X Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2024		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
CALCETEIRO	05			05	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
TOPOGRAFO					BETONEIRA				
ENCANADOR					RETROESCAVADEIRA				
ELETRICISTA					CAÇAMBA				
CARPANTEIRO									
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Darnival dos Santos Sili Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Darnival dos Santos Sili Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				




CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº:		boletim lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº:		18			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA:		21 06 24			
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☒	Sábado	☐	Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º:		020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início:		30/01/2024		Término:		31/12/2014		Quantidade de dias corridos:	
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS						
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE			
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x					
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x					
APONTADOR	01			01	NOITE						
PEDREIRO					ACIDENTES						
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.			
PINTOR											
AJUDANTE PRÁTICO											
BETONEIRO											
SEVENTE	05			05							
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS						
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO				QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA						
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA						
CARPINTEIRO					CAÇAMBA						
VIGIA DIURNO					CAÇAMBA						
ARMADOR											
OPERADOR											
JARDINEIRO											
TOTAL	13			13					TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO											
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)					
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE											
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.138/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.138/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 19		DATA: 22 06 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☒	Sábado ☐	Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2024		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
CALCETEIRO	05			05	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
TOPOGRAFO					BETONEIRA				
ENCANADOR					RETROESCAVADEIRA				
ELETRICISTA					CAÇAMBA				
CARPINTEIRO									
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 20		DATA: 24 06 24					
		☒ Segunda-feira		☐ Terça-feira	☐ Quarta-feira	☐ Quinta-feira	☐ Sexta-feira	☐ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00			SÁBADO:		às		
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133088A EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133088A EMPRESA				



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: FOLHA Nº: 21		boletim 03 lote 01	
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		☒ Segunda-feira		☒ Terça-feira	☐ Quarta-feira	☐ Quinta-feira	☐ Sexta-feira	☐ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO Nº: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2024		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	05			05					
CAÇATEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				





CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA		VOLUME Nº: boletim 03 lote 01	
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 22	
				DATA: 26 06 24	
		Segunda-feira Terça-feira X Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo			
CONTRATADA: MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS					
CONTRATO N.º: 020/2024					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014	
		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	CONDICÕES ATMOSFÉRICAS
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ x
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE x
APONTADOR	01			01	NOITE
PEDREIRO					
ENCANADOR					
PINTOR					
AJUDANTE PRÁTICO					
BETONEIRO					
SEVENTE	05			05	
CALCETEIRO	05			05	
TOPOGRAFO					
ENCANADOR					
ELETRICISTA					
CARPINTEIRO					
VIGIA DIURNO					
ARMADOR					
OPERADOR					
JARDINEIRO					
TOTAL	13			13	TOTAL
HORÁRIO DE TRABALHO					
SEG. A SEX.: 07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO: às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)			SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)		
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA			 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO		
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO			 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA		




CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 23			
						DATA: 27 06 24			
		Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira X Quinta-feira Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NORTE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
SEVENTE	05			05	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
CALCETEIRO	05			05	BETONEIRA				
TOPOGRAFO					RETROESCAVADEIRA				
ENCANADOR					CAÇAMBA				
ELETRICISTA									
CARPINTEIRO									
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº:		boletim 03 lote 01		
		OBJETO:				FOLHA Nº:		24		
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA:		28 06 24		
		Segunda-feiraTerça-feiraQuarta-feiraQuinta-feira☒Sexta-feiraSábado☐Domingo								
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS								
CONTRATO N.º:		020/2024								
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início:		30/01/2024		Término:		31/12/2014		
		Quantidade de dias corridos:								
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS					
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE		
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X				
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X				
APONTADOR	01			01	NOITE					
PEDREIRO					ACIDENTES					
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR										
AJUDANTE PRÁTICO										
BETONEIRO										
SEVENTE	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS					
CALETREIRO	05			05	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE			
TOPOGRAFO					BETONEIRA					
ENCANADOR					RETROSCAVADEIRA					
ELETRICISTA					CAÇAMBA					
CARPINTEIRO										
VIGIA DIURNO										
ARMADOR										
OPERADOR										
JARDINEIRO										
TOTAL	13			13			TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO										
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às		
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)					
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE										
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113308BA EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113308BA EMPRESA					



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 25		DATA: 29 06 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☒	Sábado ☐	Domingo ☐
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO	05			05					
SEVENTE	05			05					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	13			13	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE:						DIÁRIO DE OBRA								VOLUME Nº : boletim 03 lote 01			
						OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA						FOLHA Nº : 26					
												DATA: 01 07 24					
X Segunda-feira						Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira		☐ Sábado		☐ Domingo	
CONTRATADA:		MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS															
CONTRATO N.º :		020/2024															
PRAZO DE EXECUÇÃO:				Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:									
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS											
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE									
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x											
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x											
APONTADOR	01			01	NOITE												
PEDREIRO					ACIDENTES												
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.									
PINTOR																	
AJUDANTE PRÁTICO																	
BETONEIRO	05			05													
SEVENTE	05			05													
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS												
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO								QUANTIDADE				
ENCANADOR					BETONEIRA												
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA												
CARPINTEIRO					CAÇAMBA												
VIGIA DIURNO																	
ARMADOR																	
OPERADOR																	
JARDINEIRO																	
TOTAL	13			13	TOTAL												
HORÁRIO DE TRABALHO																	
SEG. A SEX. :		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO :		às									
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)								SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE																	
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA								 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO									
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO								 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA									




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01										
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 27		DATA: 02 07 24												
		Segunda-feira		X	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☐	Sábado	☐	Domingo				
CONTRATADA: MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS																
CONTRATO N.º: 020/2024																
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:										
EFETIVO													CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS			
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE								
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x										
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x										
APONTADOR	01			01	NOITE											
PEDREIRO					ACIDENTES											
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.								
PINTOR																
AJUDANTE PRÁTICO																
BETONEIRO	05			05												
SEVENTE	05			05												
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS											
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO			QUANTIDADE								
ENCANADOR					BETONEIRA											
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA											
CARPINTEIRO					CAÇAMBA											
VIGIA DIURNO																
ARMADOR																
OPERADOR																
JARDINEIRO																
TOTAL	13			13				TOTAL								
HORÁRIO DE TRABALHO																
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às								
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)										
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE																
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO										
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA										



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01						
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 28		DATA: 03 07 24								
		Segunda-feira		Terça-feira	X	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☐	Sábado	☐	Domingo
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS												
CONTRATO N.º: 020/2024												
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:						
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS						
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE				
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x						
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x						
APONTADOR	01			01	NOITE							
PEDREIRO					ACIDENTES							
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.				
PINTOR												
AJUDANTE PRÁTICO												
BETONEIRO	05			05								
SEVENTE	05			05								
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS							
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE					
ENCANADOR					BETONEIRA							
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA							
CARPINTEIRO					CAÇAMBA							
VIGIA DIURNO												
ARMADOR												
OPERADOR												
JARDEINEIRO												
TOTAL	13			13	TOTAL							
HORÁRIO DE TRABALHO												
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e		14:00 às 17:00		SÁBADO:		às				
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)						
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE												
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 300011330684 EMPRESA						 Dervaldo dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						
 Dervaldo dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 300011330684 EMPRESA						




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 29			
						DATA: 04 07 24			
		Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira X Quinta-feira Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO	05			05					
SEVENTE	05			05					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR	01			01					
JARDINEIRO									
TOTAL	14			14		TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:	07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:	às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PRELIMINARES									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.138/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.138/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº: 30			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 05 07 24			
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	☒ Sexta-feira	Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	09			09					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	21			21	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO PRELIMINARES									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 31		DATA: 08 07 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☒	Sábado ☐	Domingo
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos.			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	11			11					
CAÇATEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	25			25	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº:		boletim 03 lote 01	
		OBJETO:				FOLHA Nº:		32	
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA:		08 07 24	
		☒ Segunda-feira ☐ Terça-feira ☐ Quarta-feira ☐ Quinta-feira ☐ Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	07			07	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	19			19					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	41			41	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 33		DATA: 09 07 24					
		Segunda-feira ☒		Terça-feira ☐	Quarta-feira ☐	Quinta-feira ☐	Sexta-feira ☐	Sábado ☐	Domingo ☐
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	07			07	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	19			19					
CALCETEIRO	05			05	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	41			41			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				




CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº:		boletim 03 lote 01	
		OBJETO:				FOLHA Nº:		34	
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA:		10 07 24	
		Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira ☐				Sábado ☐		Domingo ☐	
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início:		30/01/2024		Término:		31/12/2014	
		Quantidade de dias corridos:							
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	04			04	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE C. AFAST. S. AFAST.				
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	11			11					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO QUANTIDADE				
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	25			25	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.	07:00	às	12:00	e	14:00	às	17:00	SÁBADO:	
								às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001132068A EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001132068A EMPRESA				




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº : FOLHA Nº : DATA:		boletim 03 lote 01 35 11 07 24	
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira X Quinta-feira Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA: MONAKO SERVICOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º : 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	04			04	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	13			13					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL				00	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX :		07:00 às 12:00		e 14:00 às 17:00		SÁBADO :		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ. 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FURINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ. 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FURINO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO:				FOLHA Nº: 36			
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 12 07 24			
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	☒ Sexta-feira	Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA:	MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS								
CONTRATO N.º:	020/2024								
PRAZO DE EXECUÇÃO:	Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias contidos:				
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	04			04	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	11			11					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	25			25		TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:	07:00	às	12:00	e	14:00	às	17:00	SÁBADO:	às
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: FOLHA Nº: 37		boletim 03 lote 01	
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 13 07 24			
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☒ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos.			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	02			02	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	11			11					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO	02			02	CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	25			25			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e		14:00 às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 38		DATA: 15 07 24					
		☒ Segunda-feira		☐ Terça-feira	☐ Quarta-feira	☐ Quinta-feira	☐ Sexta-feira	☐ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEGREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17	TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:	07:00	às	12:00	e	14:00	às	17:00	SÁBADO:	às
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Derval dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FILHO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01							
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 39		DATA: 16 07 24									
		Segunda-feira		X	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	☐	Sábado	☐	Domingo	
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS													
CONTRATO N.º: 020/2024													
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início:		30/01/2024		Término:		31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS								
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE					
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X							
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X							
APONTADOR	01			01	NOITE								
PEDREIRO					ACIDENTES								
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.		S. AFAST.				
PINTOR	05			05									
AJUDANTE PRÁTICO													
BETONEIRO													
SEVENTE	07			07									
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS								
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO				QUANTIDADE				
ENCANADOR					BETONEIRA								
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA								
CARPINTEIRO					CAÇAMBA								
VIGIA DIURNO													
ARMADOR													
OPERADOR													
JARDINEIRO													
TOTAL	17			17					TOTAL				
HORÁRIO DE TRABALHO													
SEG. A SEX.:		07:00		às 12:00		e 14:00		às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)							
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA													
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO													
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA						 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO							
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA							





CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº:		boletim 03 lote 01	
		OBJETO:				FOLHA Nº:		40	
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA:		17 07 24	
		Segunda-feira Terça-feira X Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR	05			05					
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	07			07					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA	02			02	RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	17			17		TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX :		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO :		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PINTURA									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 41		DATA: 18 07 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	X Quinta-feira	Sexta-feira	☐ Sábado	☐ Domingo
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/06/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO					ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	02			02					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO	02			02					
TOTAL	07			07		TOTAL			
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 2000113306BA EMPRESA					 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 2000113306BA EMPRESA				




CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01						
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 42		DATA: 19 07 24								
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	X	Sexa-feira	☐	Sábado	☐	Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS										
CONTRATO N.º:		020/2024										
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/06/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:						
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS						
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE				
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X						
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X						
APONTADOR	01			01	NOITE							
PEDREIRO					ACIDENTES							
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.				
PINTOR												
AJUDANTE PRÁTICO												
BETONEIRO												
SEVENTE	02			02								
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS							
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE					
ENCANADOR					BETONEIRA							
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA							
CARPINTEIRO					CAÇAMBA							
VIGIA DIURNO												
ARMADOR												
OPERADOR												
JARDINEIRO	02			02								
TOTAL	07			07	TOTAL							
HORÁRIO DE TRABALHO												
SEG. A SEX.:		07:00		às	12:00		e	14:00		às	17:00	
SÁBADO:				às								
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)						SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)						
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO												
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 43		DATA: 20 07 24					
		Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☒	Sábado ☐	Domingo ☐
CONTRATADA: MONAKO SERVISOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS									
CONTRATO N.º: 020/2024									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/08/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	01			01	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.		
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	03			03					
CALÇEITEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROESCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO	02			02					
TOTAL	09			09			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e		14:00 às 17:00		SÁBADO:		às	
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PARQUE INFANTIL									
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA					 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 3000113306BA EMPRESA				





CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01							
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA		FOLHA Nº: 44		DATA: 22 07 24									
☒ Segunda-feira		☐ Terça-feira		☐ Quarta-feira		☐ Quinta-feira		☐ Sexta-feira		☐ Sábado		☐ Domingo	
CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS													
CONTRATO N.º: 020/2024													
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/06/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:							
EFETIVO						CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS							
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE					
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x							
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x							
APONTADOR	01			01	NOITE								
PEDREIRO	01			01	ACIDENTES								
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.						
PINTOR													
AJUDANTE PRÁTICO													
BETONEIRO													
SEVENTE	03			03									
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS								
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE							
ENCANADOR					BETONEIRA								
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA								
CARPINTEIRO					CAÇAMBA								
VIGIA DIURNO													
ARMADOR													
OPERADOR													
JARDINEIRO	02			02									
TOTAL	09			09	TOTAL								
HORÁRIO DE TRABALHO													
SEG. A SEX.:		07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00		SÁBADO:		às							
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)							SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)						
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PARQUE INFANTIL													
SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO													
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA							 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO						
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO							 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FERMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA						



CONTRATANTE:		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01	
		OBJETO:				FOLHA Nº: 45	
		EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				DATA: 23 07 24	
		Segunda-feira ☒		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira ☐
						Sábado ☐	Domingo
CONTRATADA:		MONAKO SERVSOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS					
CONTRATO N.º:		020/2024					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/06/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:	
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS		
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	x	
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	x	
APONTADOR	01			01	NOITE		
PEDREIRO	01			01	ACIDENTES		
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE	C. AFAST.	S. AFAST.
PINTOR							
AJUDANTE PRÁTICO							
BETONEIRO							
SEVENTE	02			02	PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS		
CAÇATEIRO					DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
TOPOGRAFO					BETONEIRA		
ENCANADOR					RETROESCAVADEIRA		
ELETRICISTA					CAÇAMBA		
CARPINTEIRO							
VIGIA DIURNO							
ARMADOR							
OPERADOR							
JARDINEIRO							
TOTAL	06			06	TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO							
SEG. A SEX.:	07:00	às	12:00	e	14:00	às	17:00
SÁBADO:				às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)				SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)			
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PARQUE INFANTIL							
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO			
 Dornival dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 14 184 136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA			



CONTRATANTE: 		DIÁRIO DE OBRA				VOLUME Nº: boletim 03 lote 01			
		OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA				FOLHA Nº: 46			
						DATA: 24 07 24			
		Segunda-feira Terça-feira X Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira ☐ Sábado ☐ Domingo							
CONTRATADA:		MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS							
CONTRATO N.º:		020/2024							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 30/01/2024		Término: 31/12/2014		Quantidade de dias corridos:			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		Início: 22/06/2022		Término:		Quantidade de dias corridos:			
EFETIVO					CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS				
FUNÇÃO	PRESENTES	FALTOSOS	OUTROS	TOTAL	TEMPO	NORMAL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE	
ENGENHEIRO	01			01	MANHÃ	X			
MESTRE/ENCARREGADO	01			01	TARDE	X			
APONTADOR	01			01	NOITE				
PEDREIRO	01			01	ACIDENTES				
ENCANADOR					TIPO DO ACIDENTE		C. AFAST.	S. AFAST.	
PINTOR									
AJUDANTE PRÁTICO									
BETONEIRO									
SEVENTE	11			11					
CALCETEIRO					PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS				
TOPOGRAFO					DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
ENCANADOR					BETONEIRA				
ELETRICISTA					RETROSCAVADEIRA				
CARPINTEIRO					CAÇAMBA				
VIGIA DIURNO									
ARMADOR									
OPERADOR									
JARDINEIRO									
TOTAL	15			15			TOTAL		
HORÁRIO DE TRABALHO									
SEG. A SEX.:		07.00 às 12.00 e 14.00 às 17.00		SÁBADO:		às			
SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATADA)					SERVIÇOS / OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE)				
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE PARQUE INFANTIL									
SERVIÇO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA					 Dernival Dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO				
 Dernival Dos Santos Silva Engenheiro Civil CREA: 0520091574 FISCALIZAÇÃO					 MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 14.184.136/0001-03 ANDERSON SANTOS FIRMO ENGENHEIRO CIVIL CREA BA Nº 30001133068A EMPRESA				

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

RELATÓRIO FOTOGRAFICO.

OBRA: CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CIPÓ-BA..

EMPRESA CONTRATADA: MONAKO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 020/2024

OBJETIVO: O presente relatório tem por finalidade demonstrar a evolução da obra. Conforme contrato 020/2024 em cooperação financeira com Desenhahia boletim de medição 03 (Lote 01).

DESCRIÇÃO.

Segue relatório fotográfico do desenvolvimento das obras.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça do Calumbi Anexo 01:**

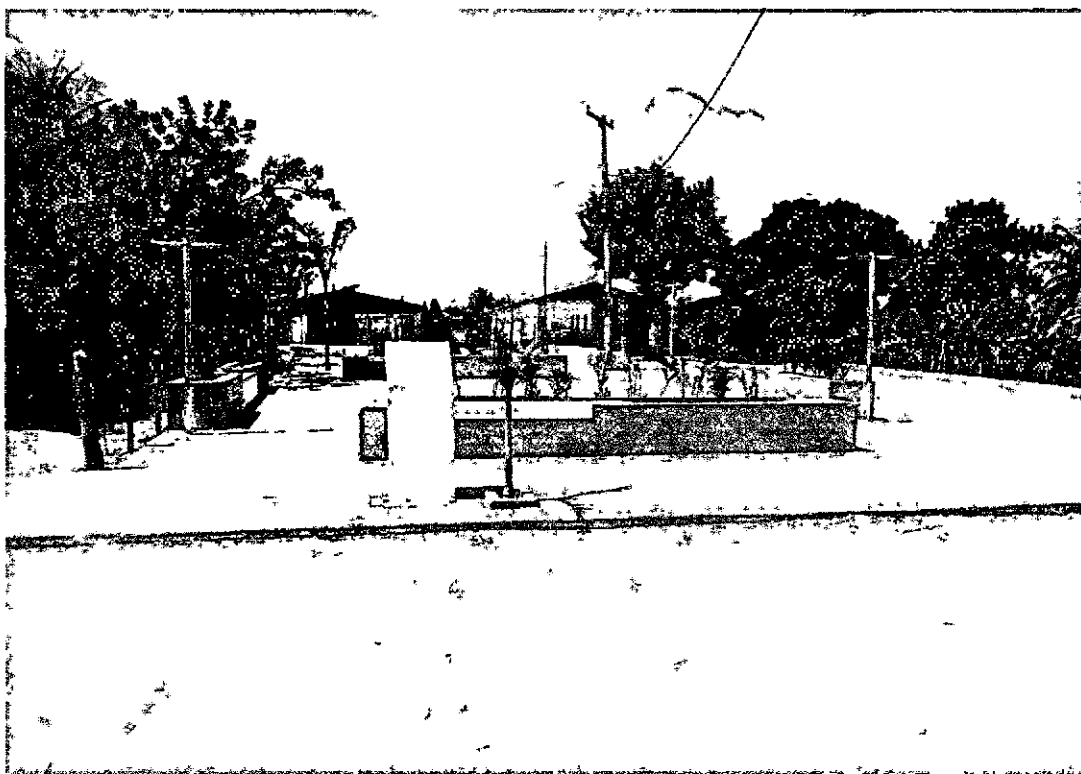

- **Praça do Calumbi Anexo 02:**






PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça do Calumbi Anexo 03:**

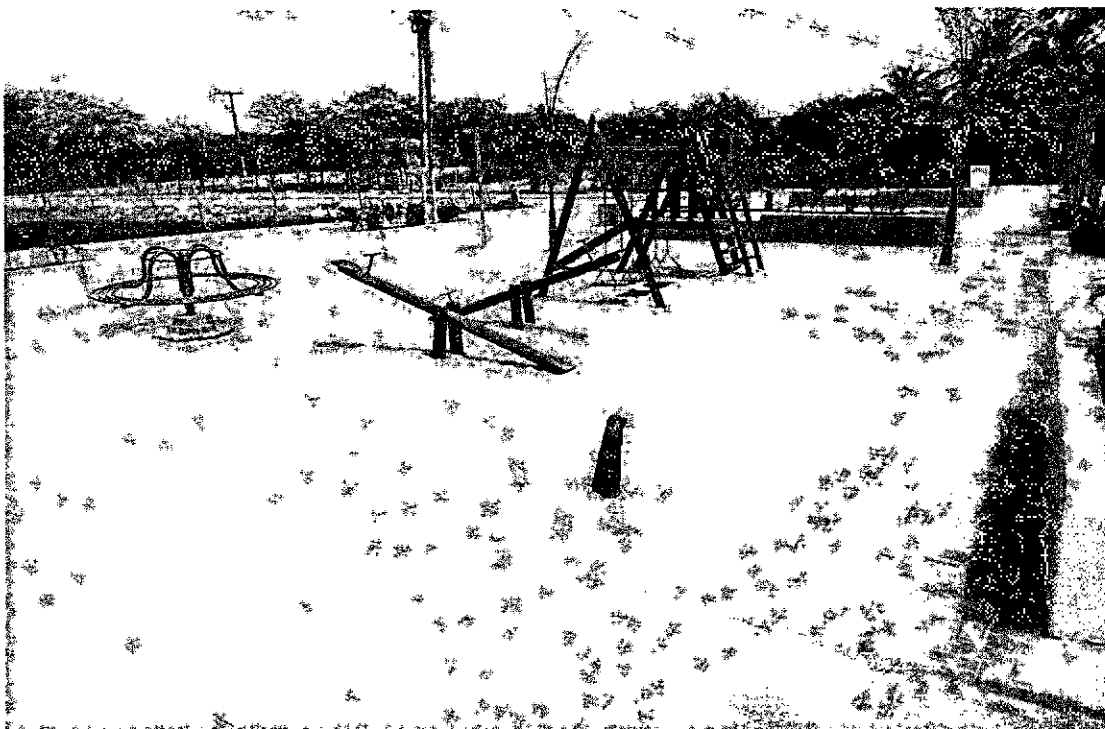

- **Praça do Calumbi 04:**

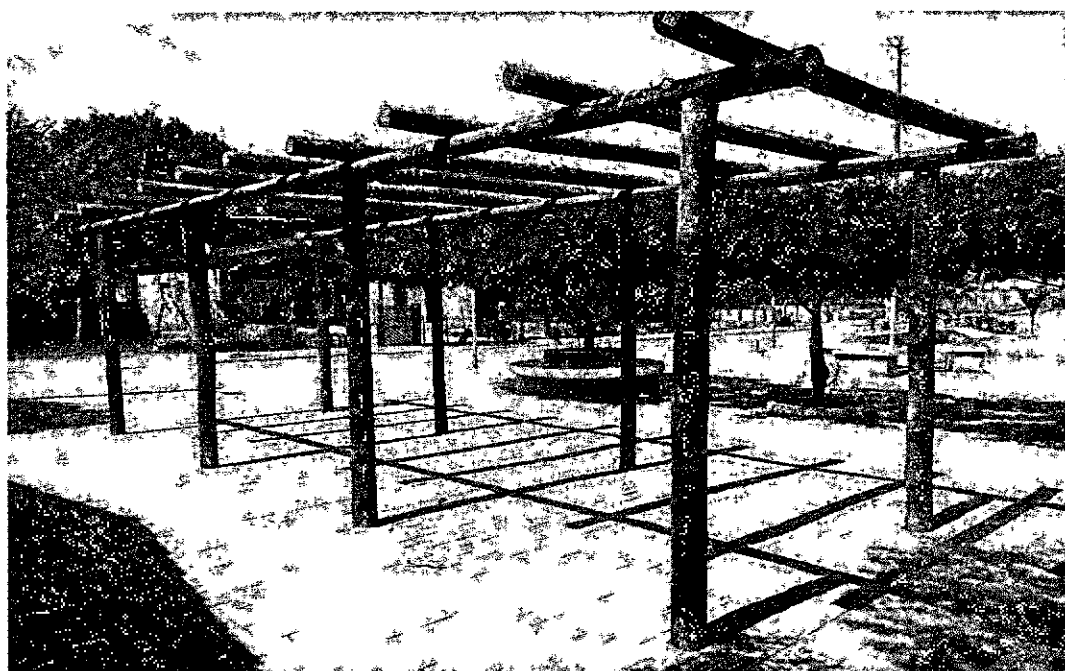




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça do Calumbi 05:**

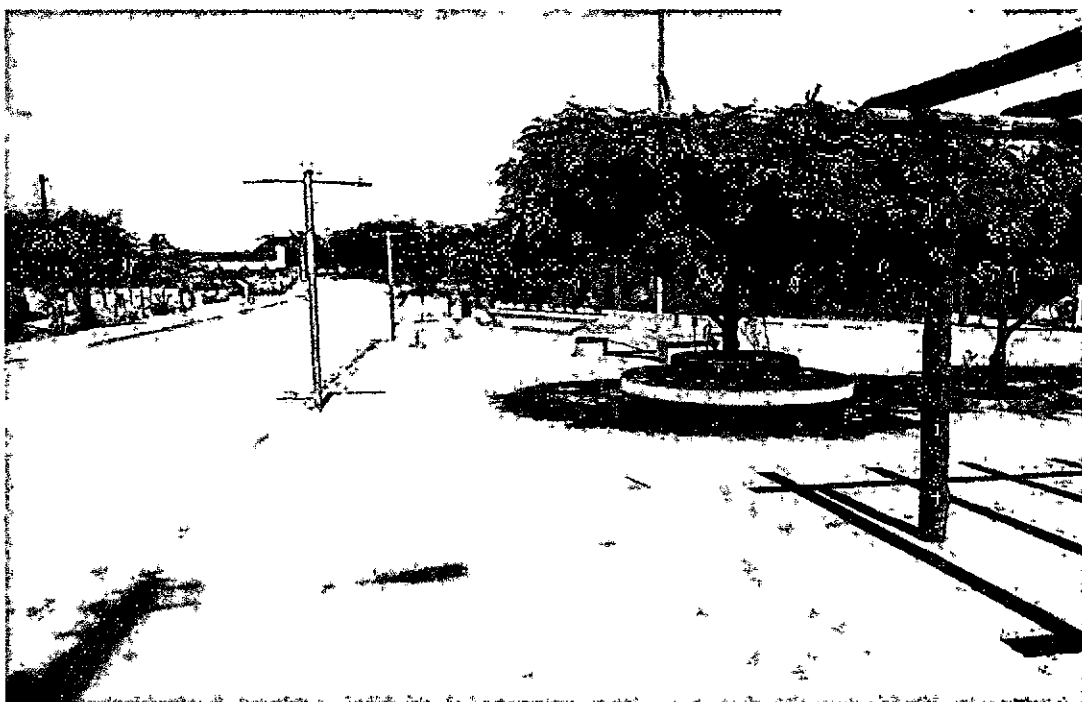

- **Praça da Igreja Católica Anexo 06:**

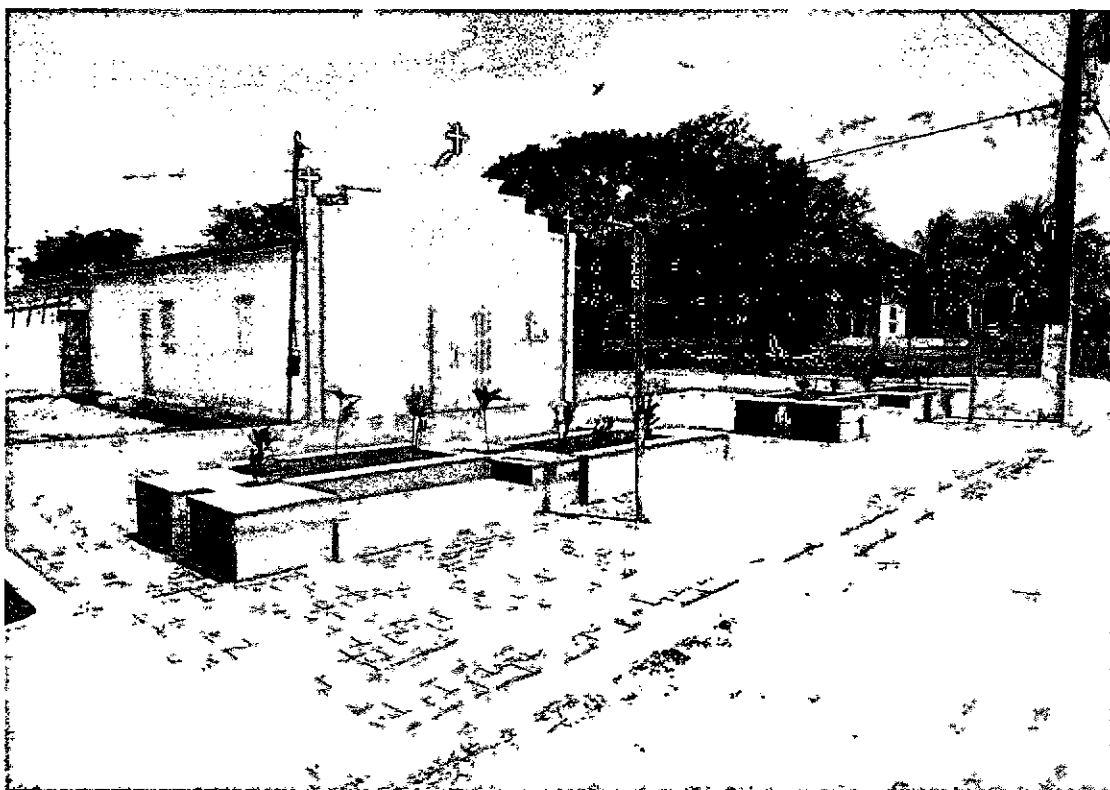




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da Igreja Católica Anexo 07:**

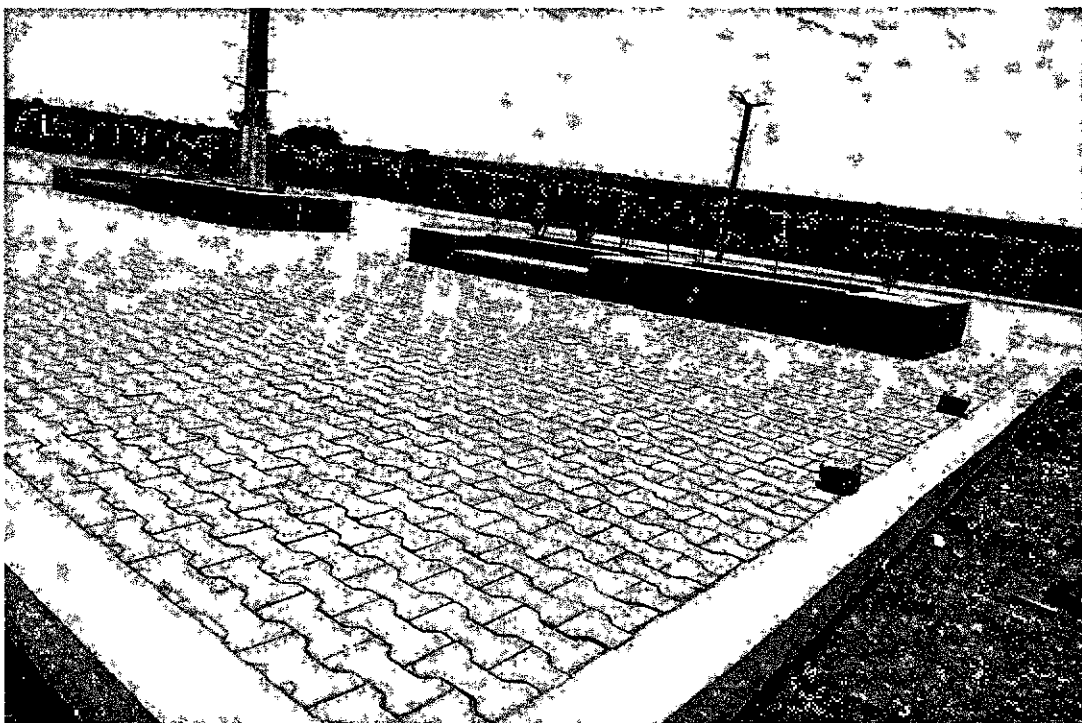

- **Praça da Igreja Católica Anexo 08:**

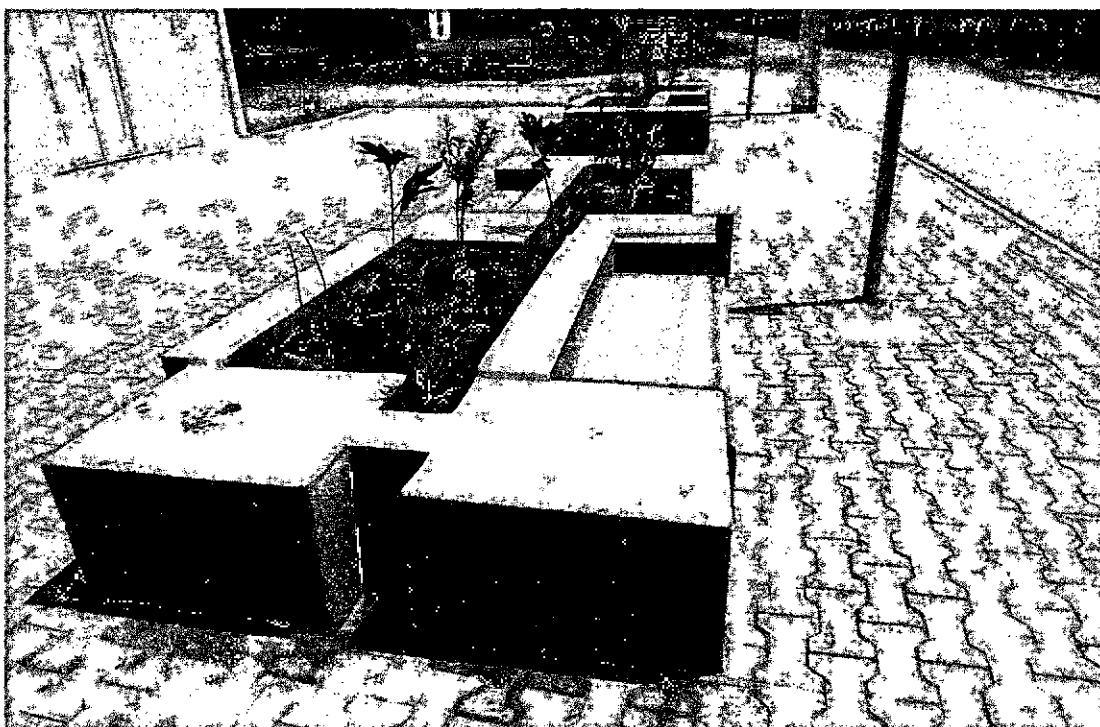




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da Igreja Católica 09:**

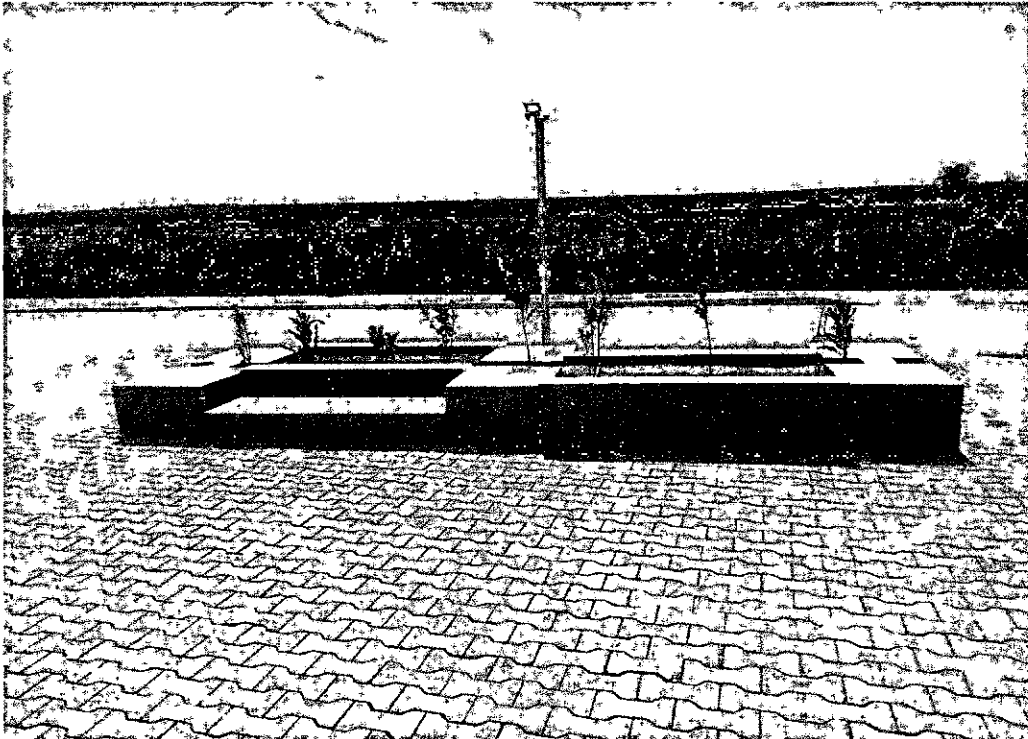

- **Praça da Igreja Católica 10:**

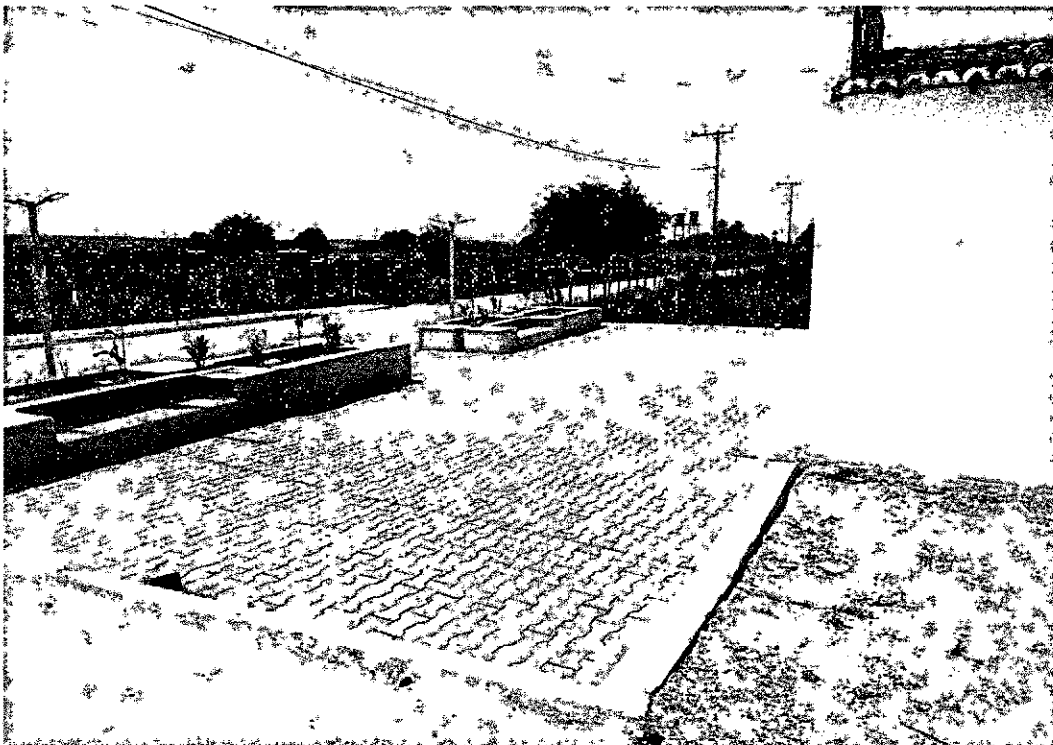




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da Bananeira (Em frente a UBS) Anexo 11:**

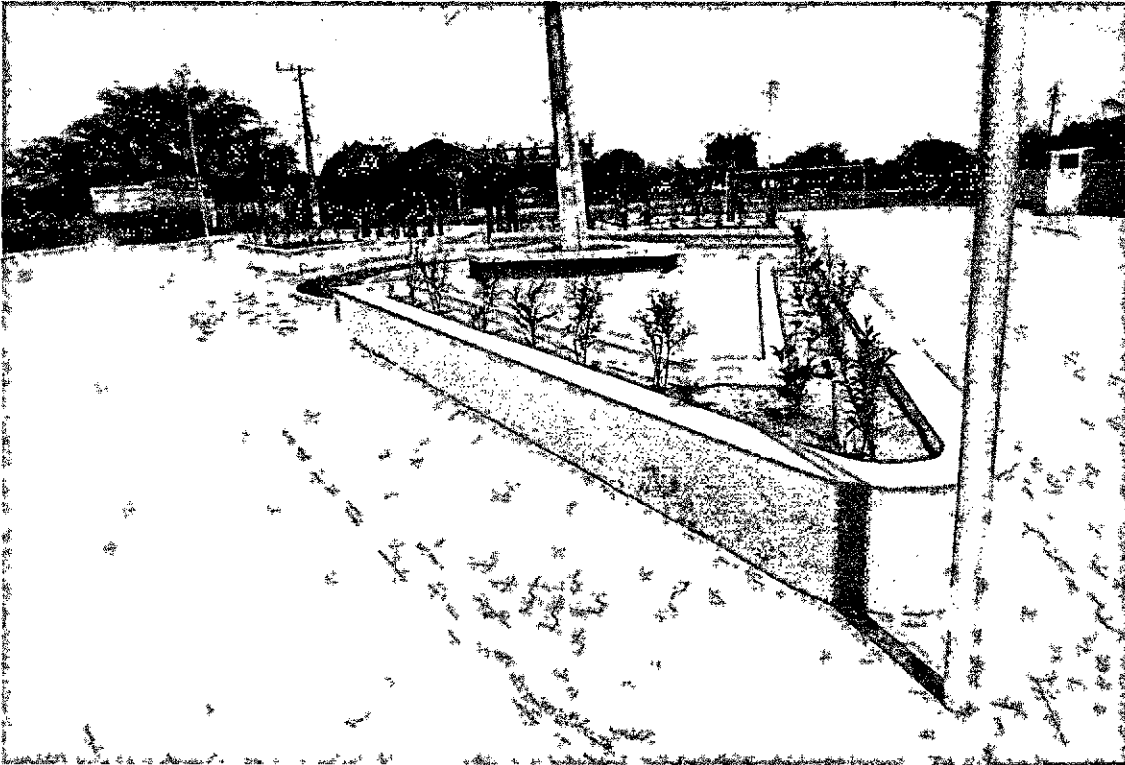

- **Praça da Bananeira (Em frente a UBS) Anexo 12:**






PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça da Bananeira (Em frente UBS) Anexo 13:**

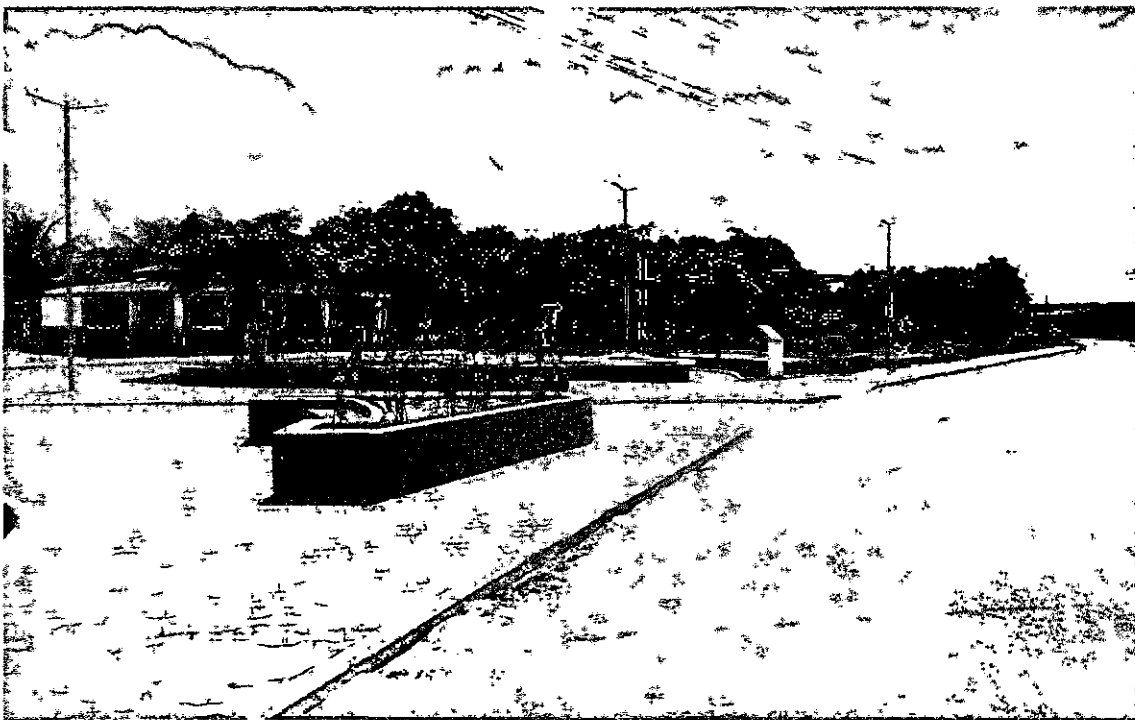

- **Praça da Bananeira (Em frente UBS) Anexo 14:**

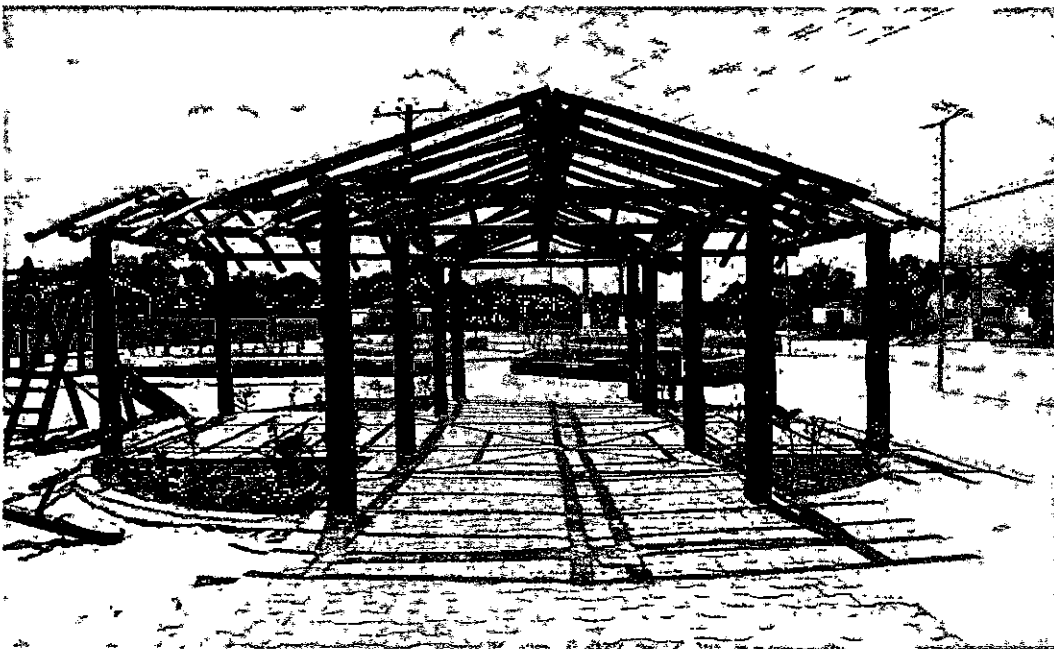




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da Bananeira (Em frente UBS) Anexo 15:**

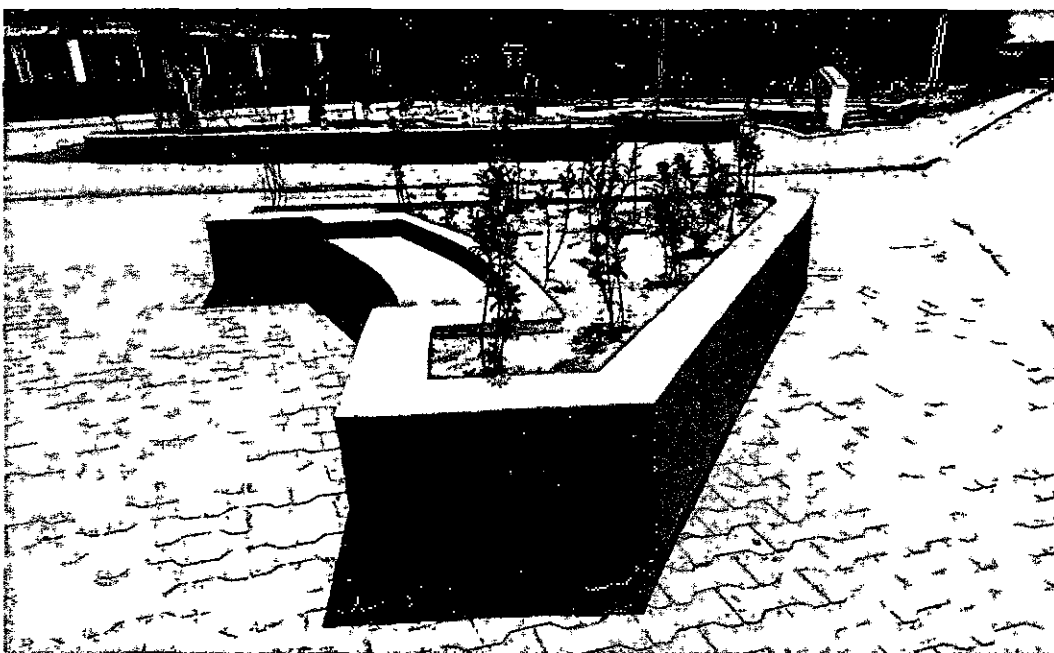

- **Praça Berta veloso Anexo 16:**

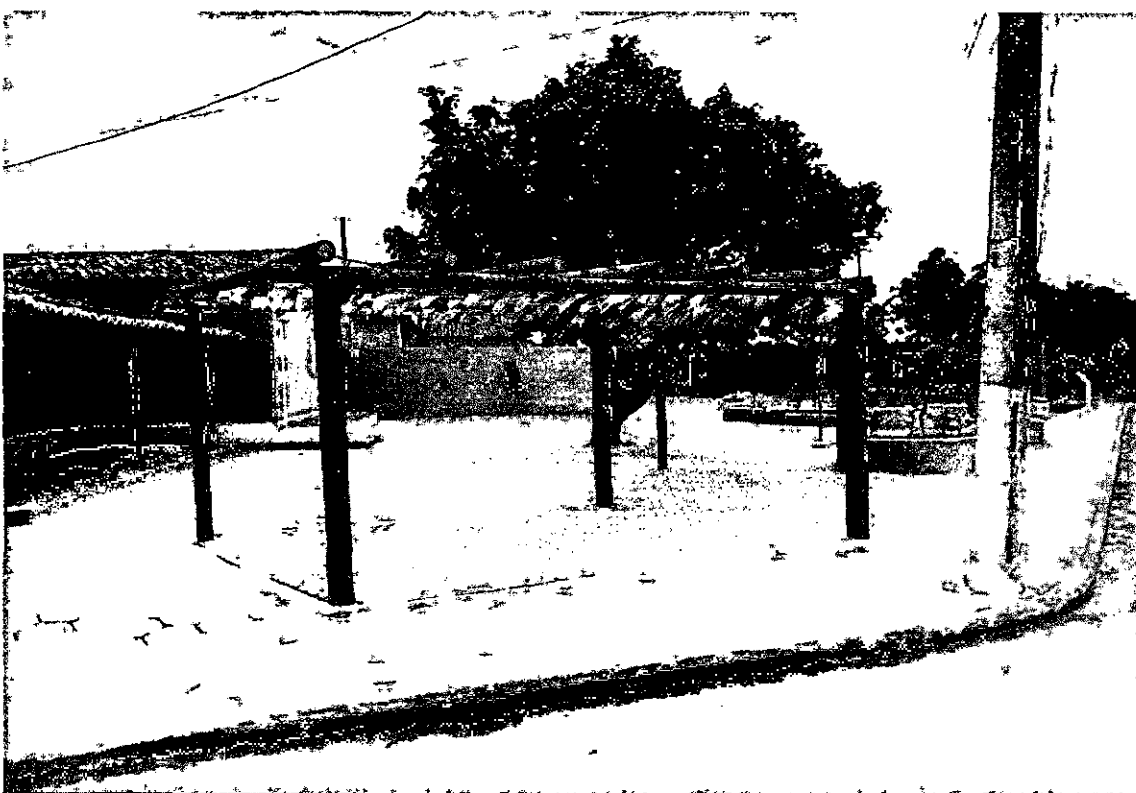




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça Berta veloso Anexo 17:**

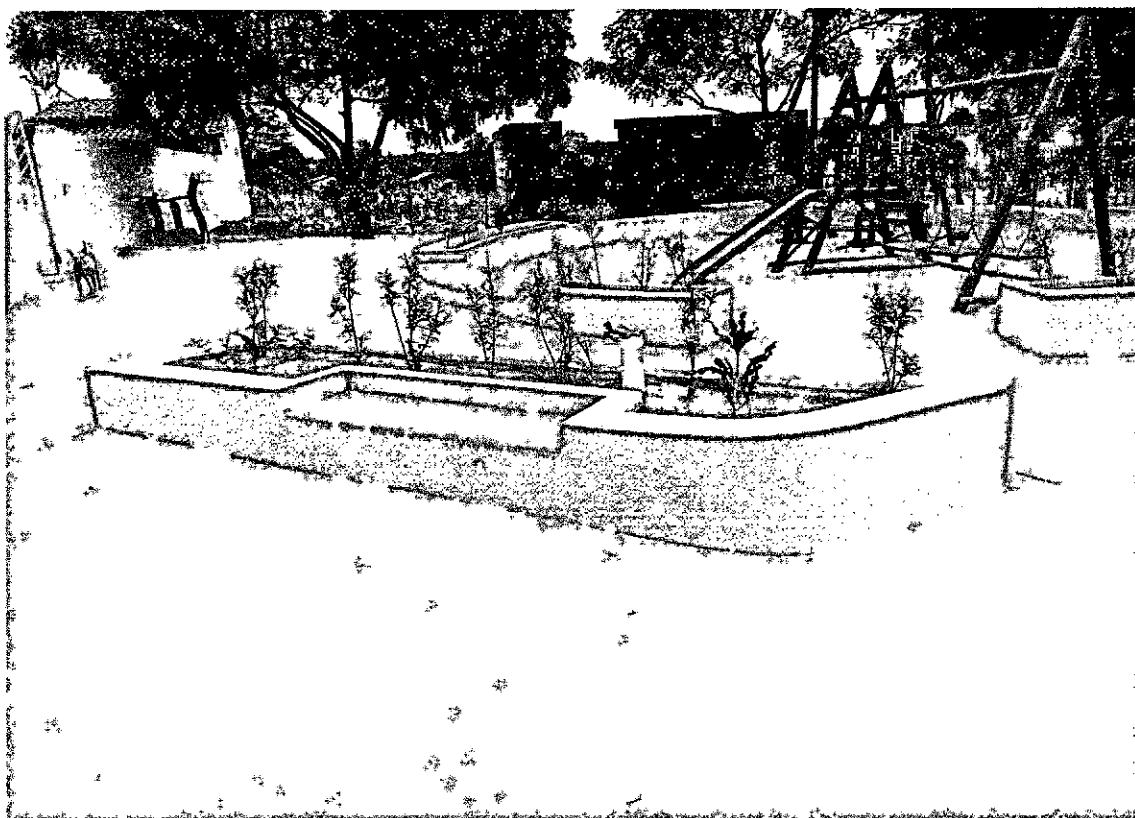

- **Praça Berta veloso Anexo 18:**

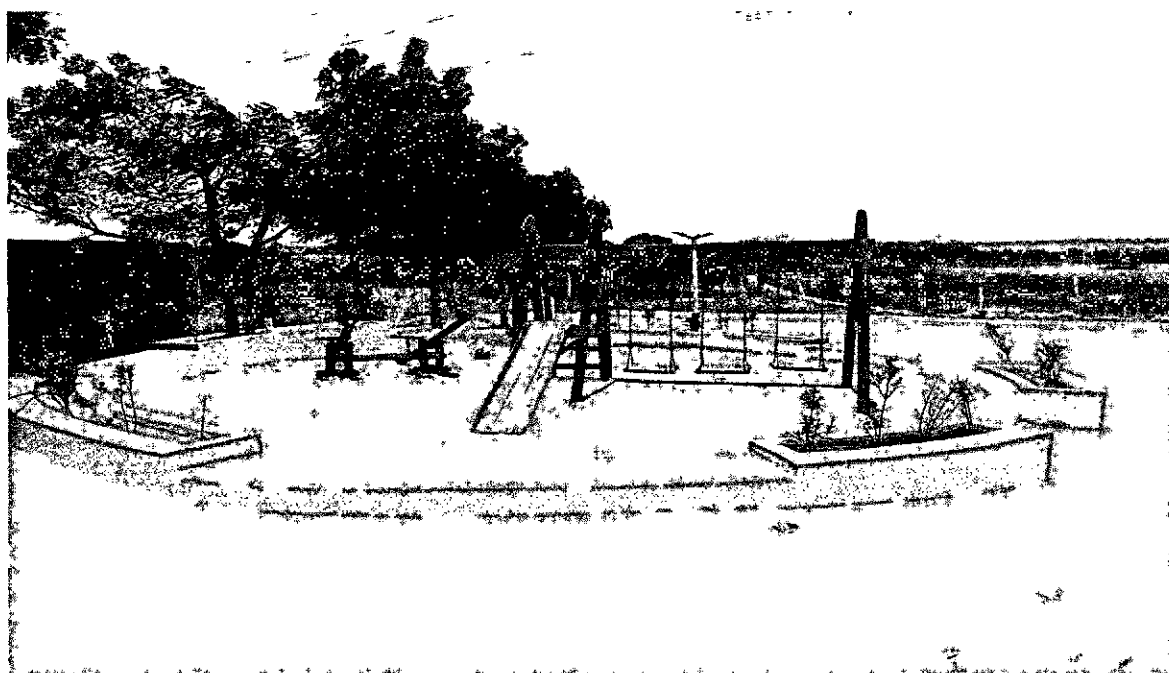




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça Berta veloso Anexo 19:**

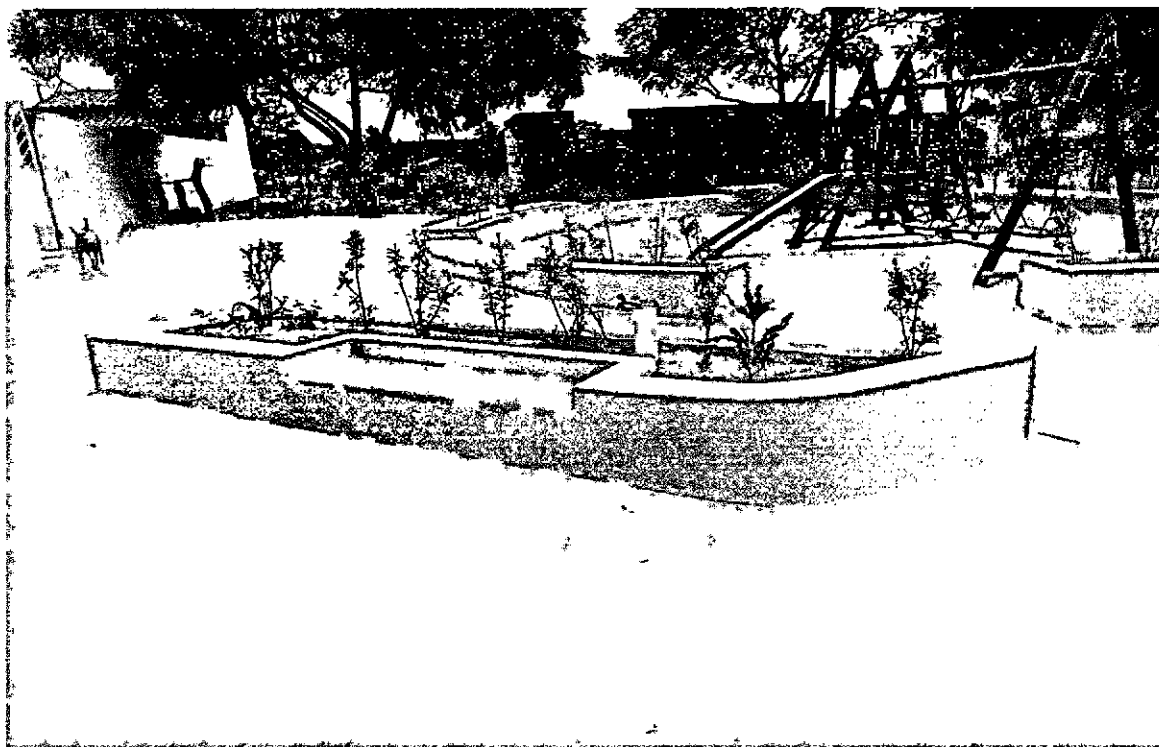

- **Praça Berta veloso Anexo 20:**

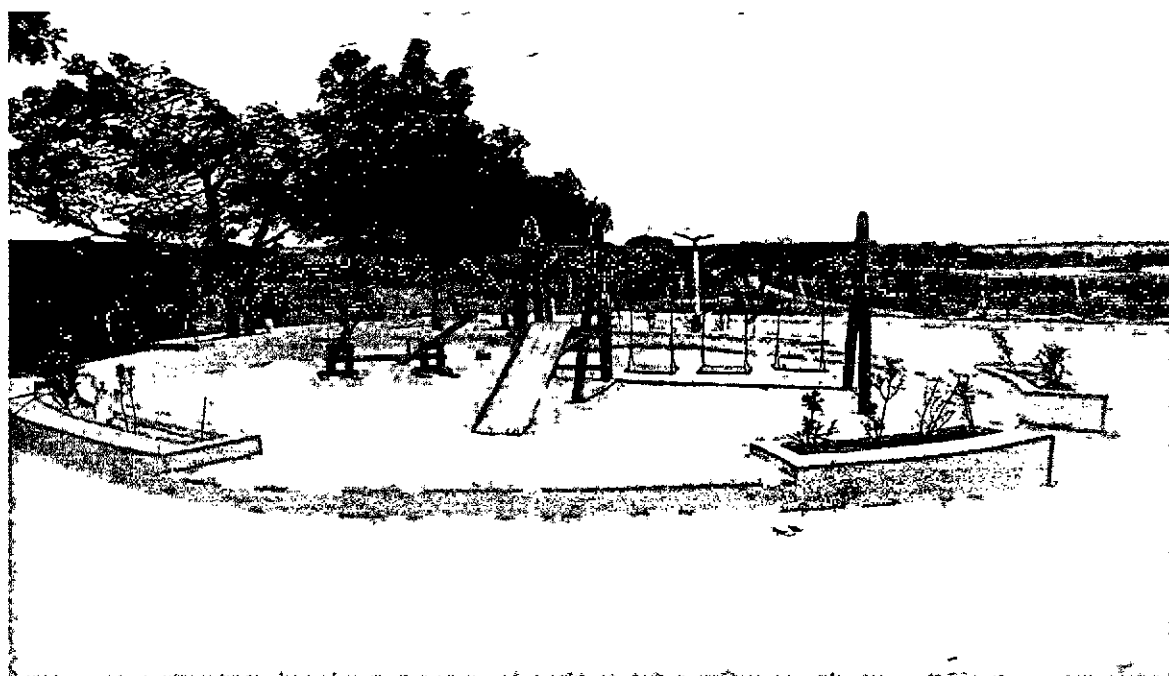




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO



Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça do Povoado Tamanduá Anexo 21:**

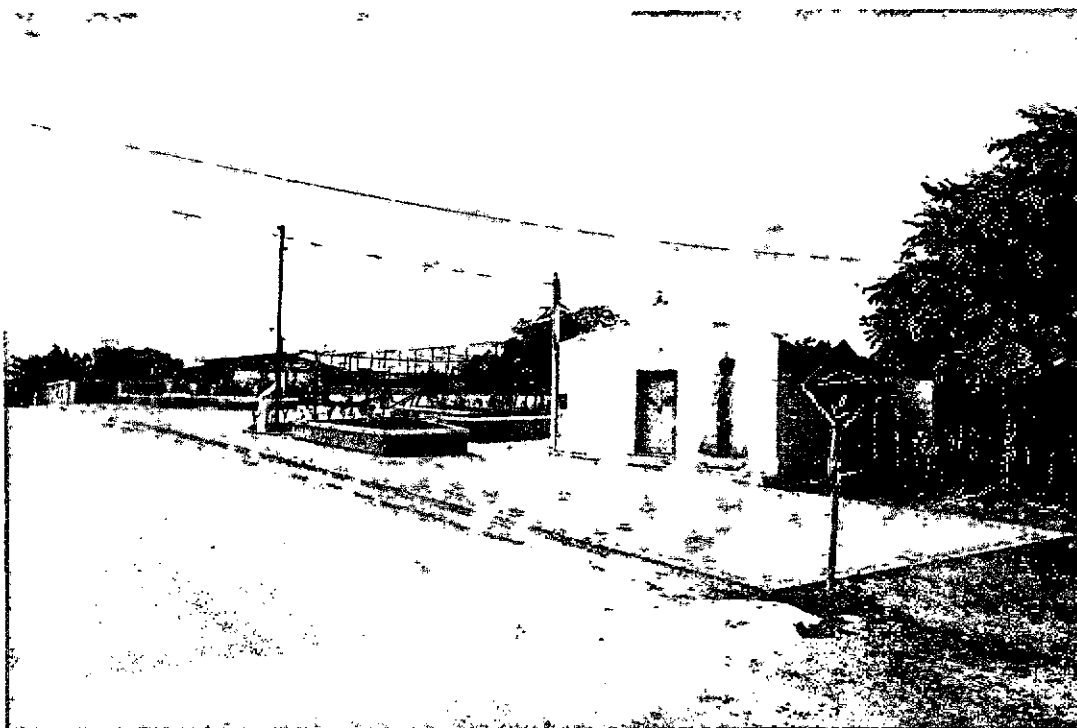

- **Praça do Povoado Tamanduá Anexo 22:**






PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça do Povoado Tamanduá Anexo 23:**

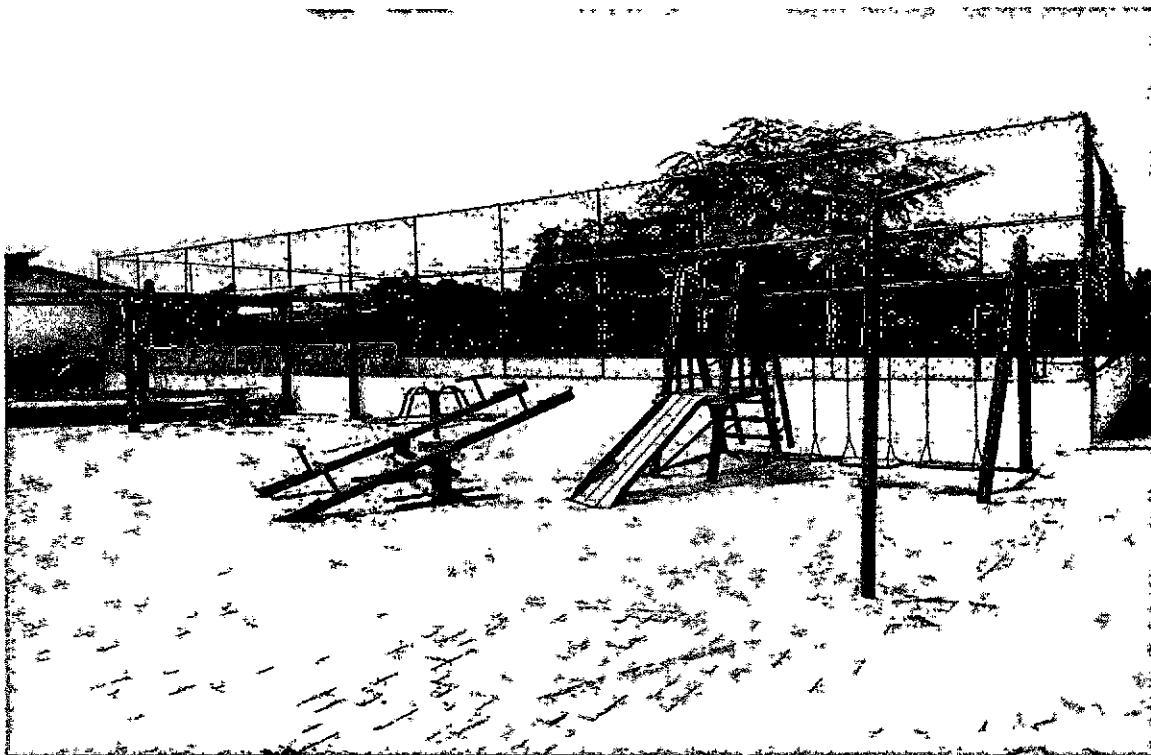

- **Praça do Povoado Tamanduá Anexo 24:**

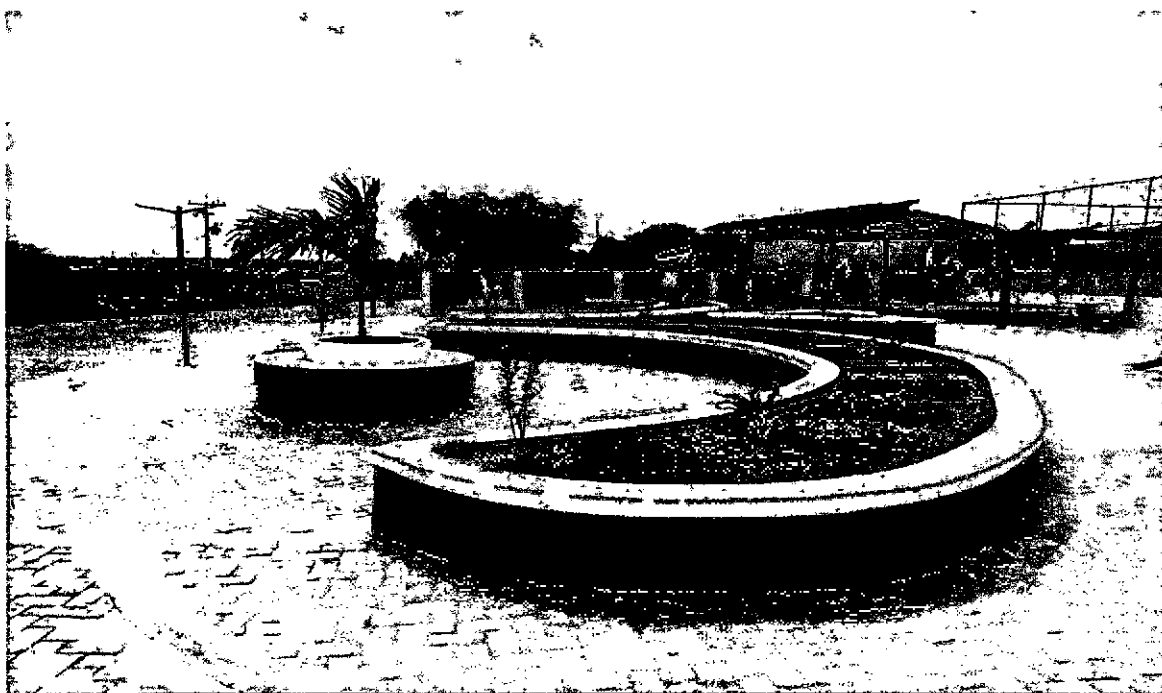




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça do Povoado Tamanduá Anexo 25:**

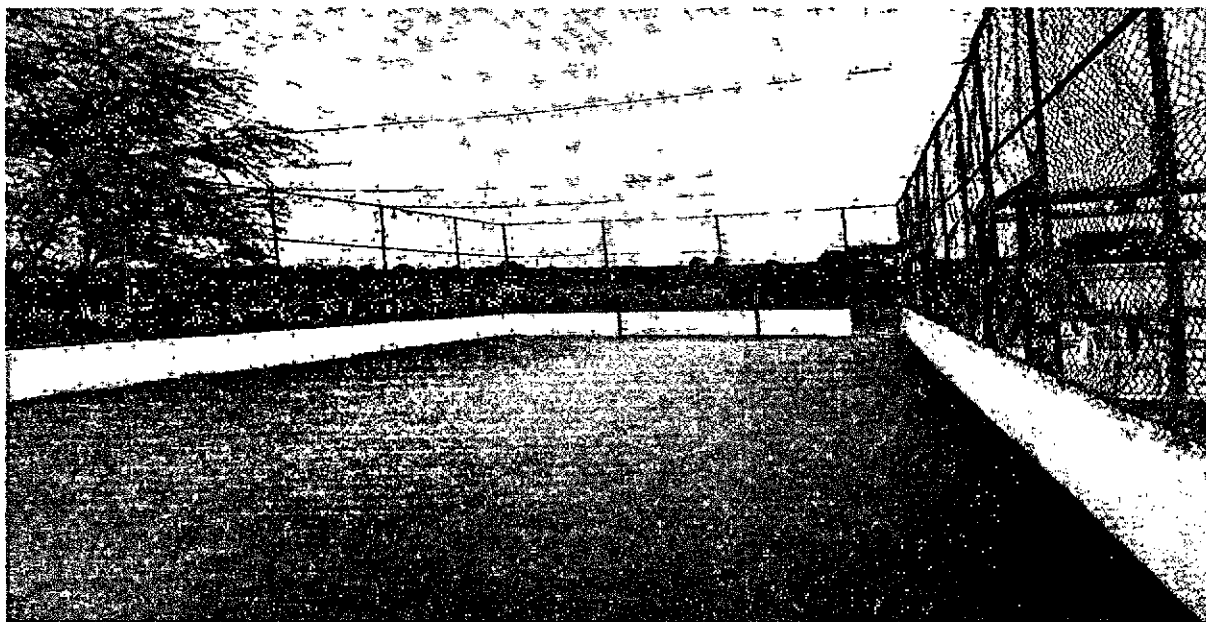

- **Praça da Linha verde Anexo 26:**

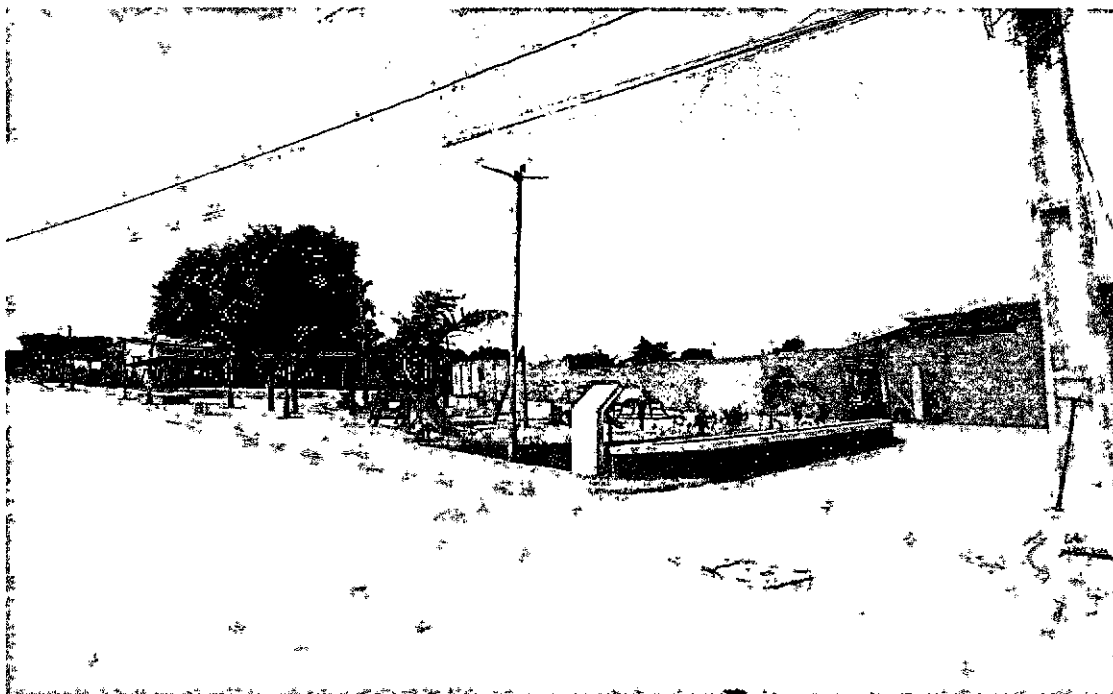



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça da Linha verde Anexo 27:**



- **Praça da Linha verde Anexo 28:**

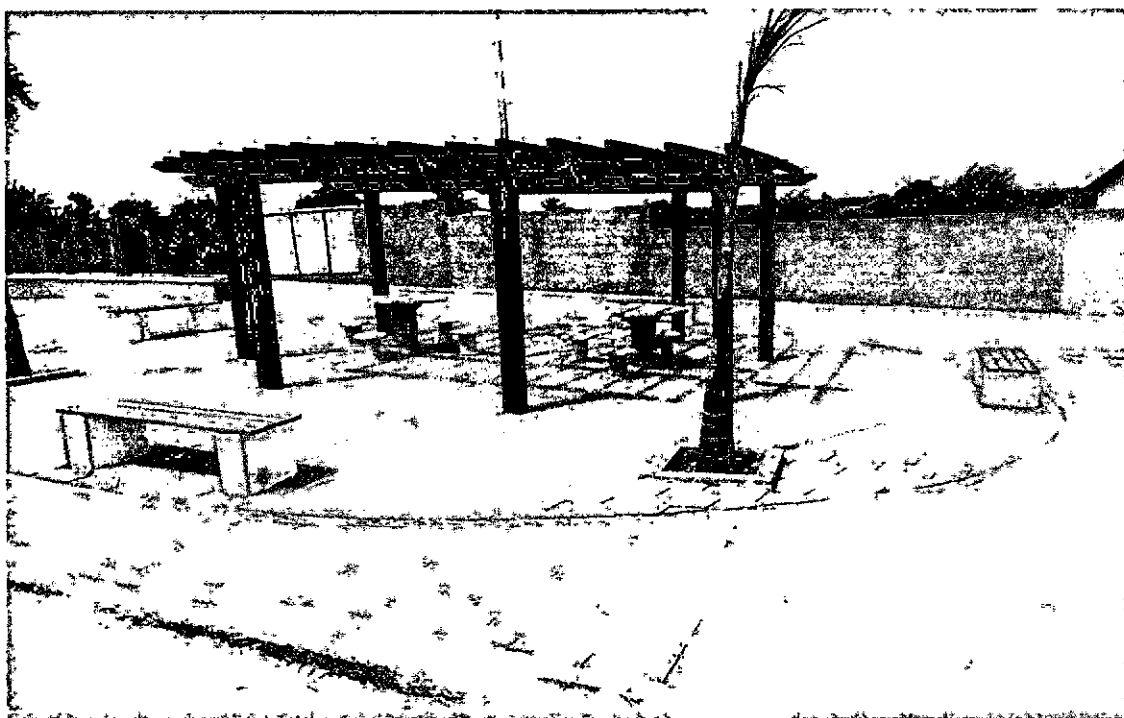




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da Linha verde Anexo 29:**

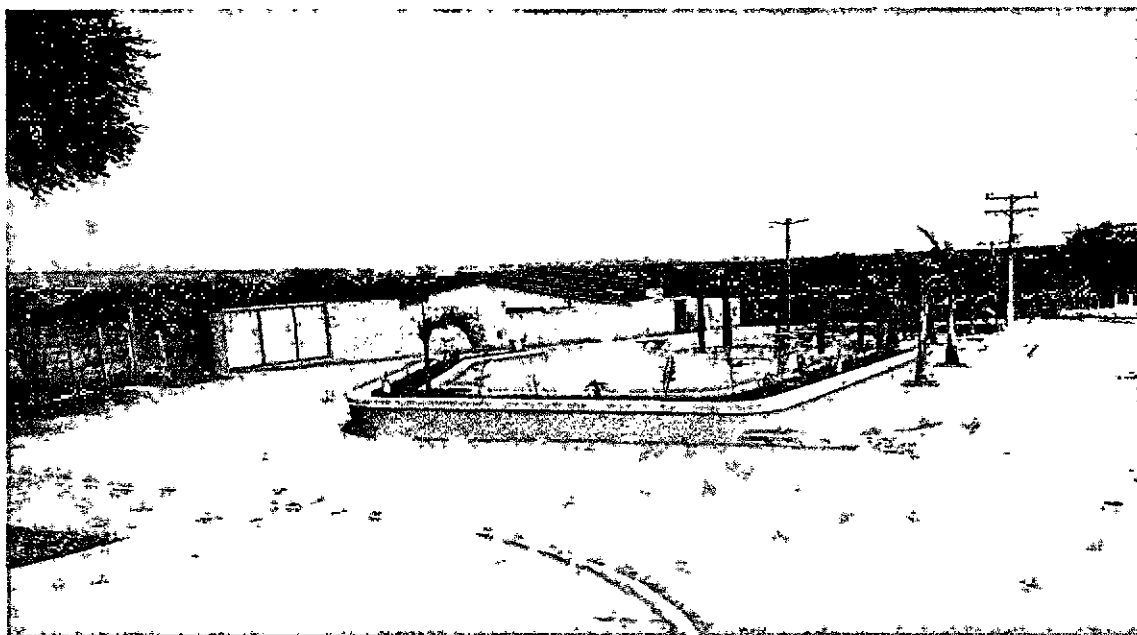

- **Praça da Linha verde Anexo 30:**

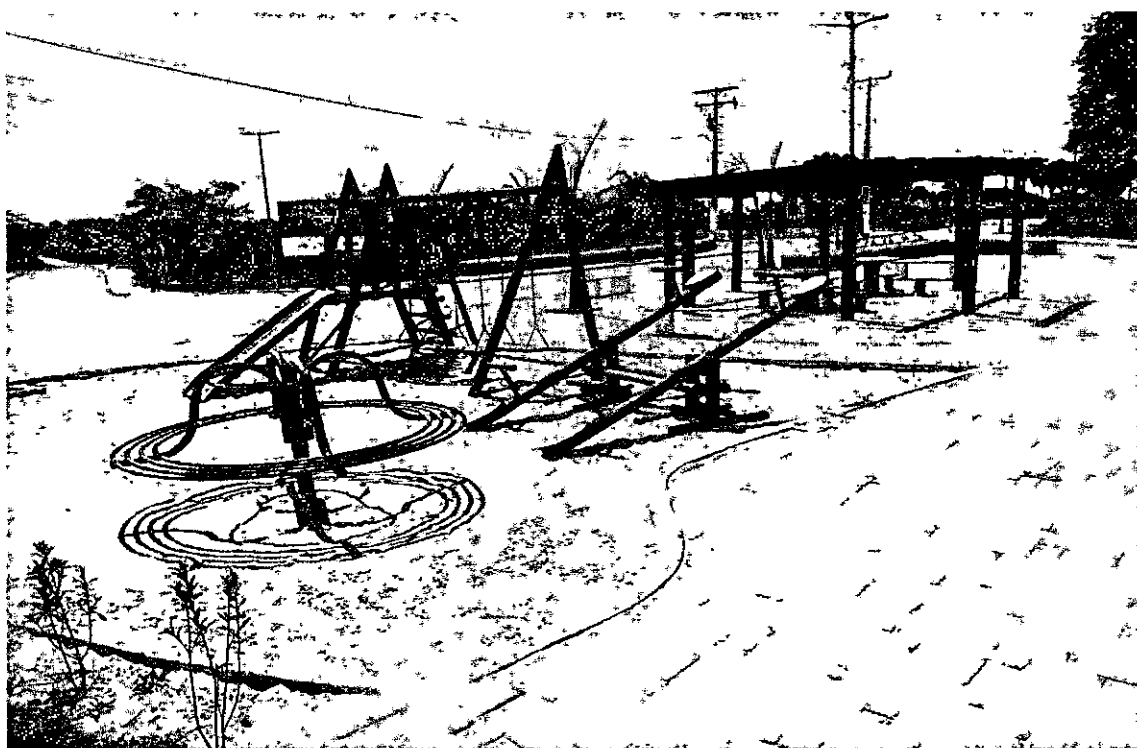




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da comunidade quilombola Várzea Grande anexo 31:**

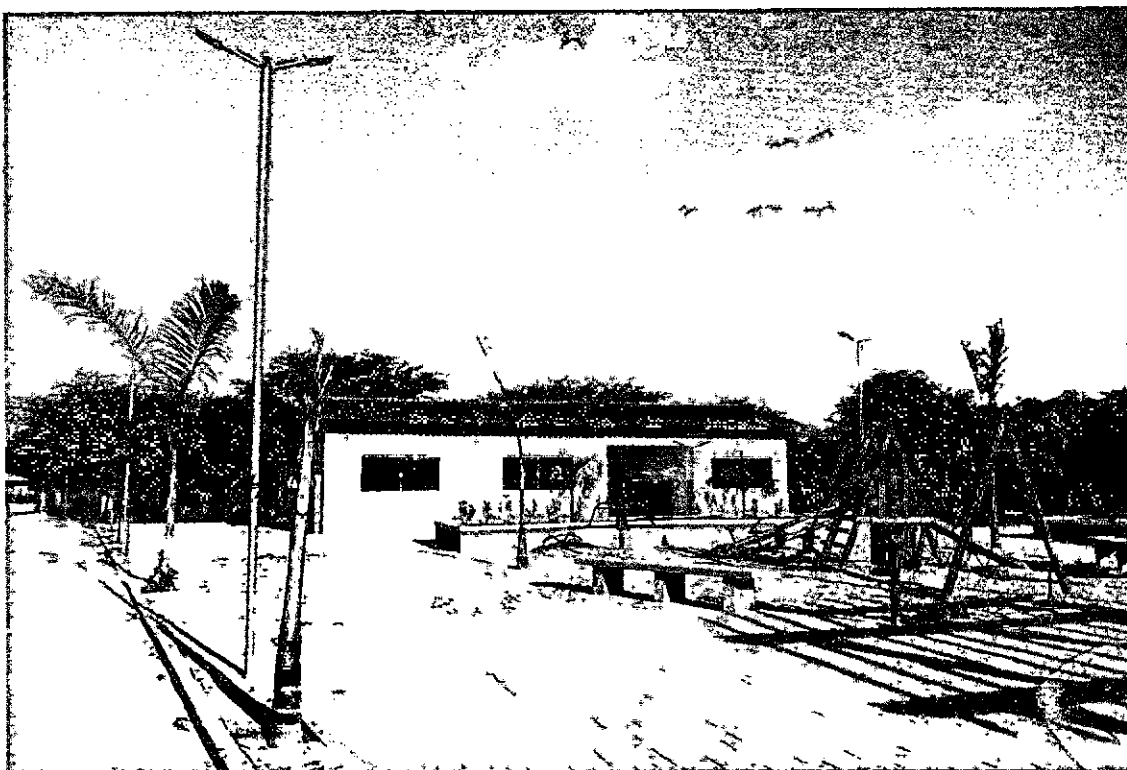

- **Praça da comunidade quilombola Várzea Grande anexo 32:**

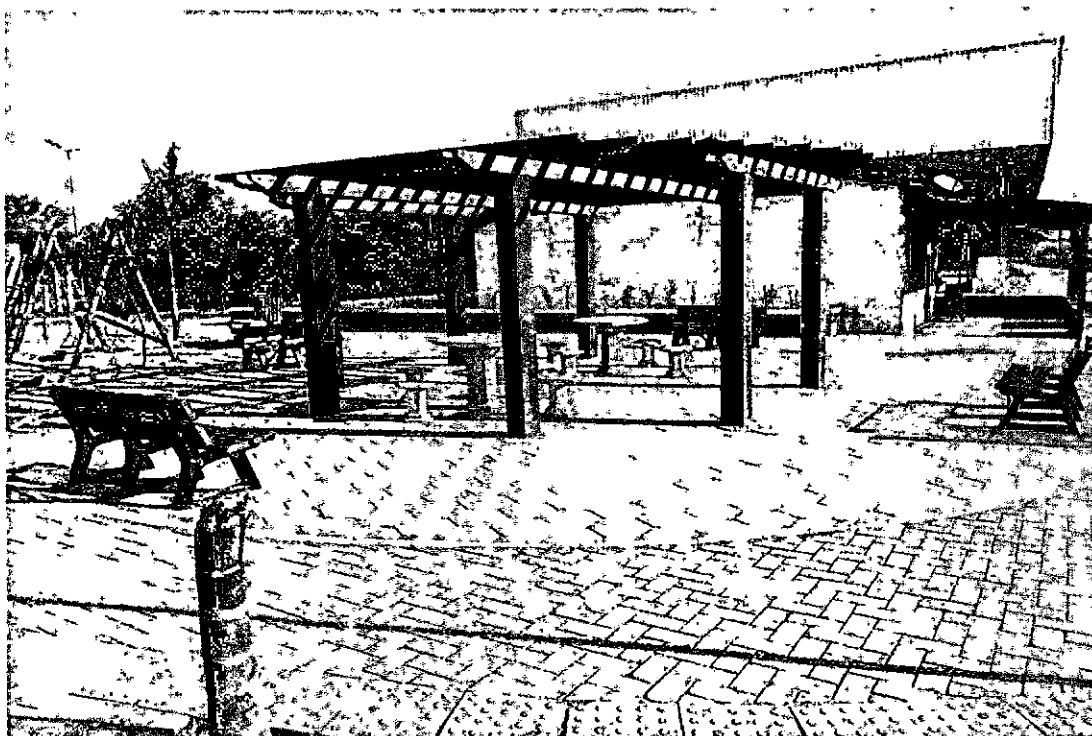




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b116927

- **Praça da comunidade quilombola Várzea Grande anexo 33:**

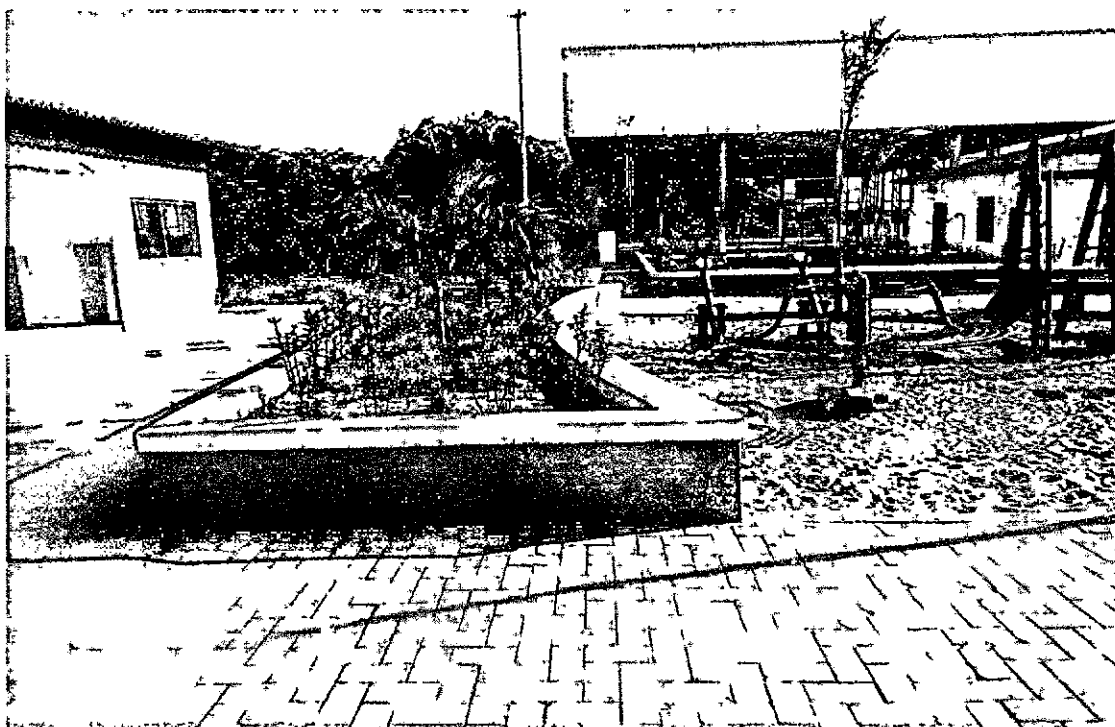

- **Praça da comunidade quilombola Várzea Grande anexo 34:**

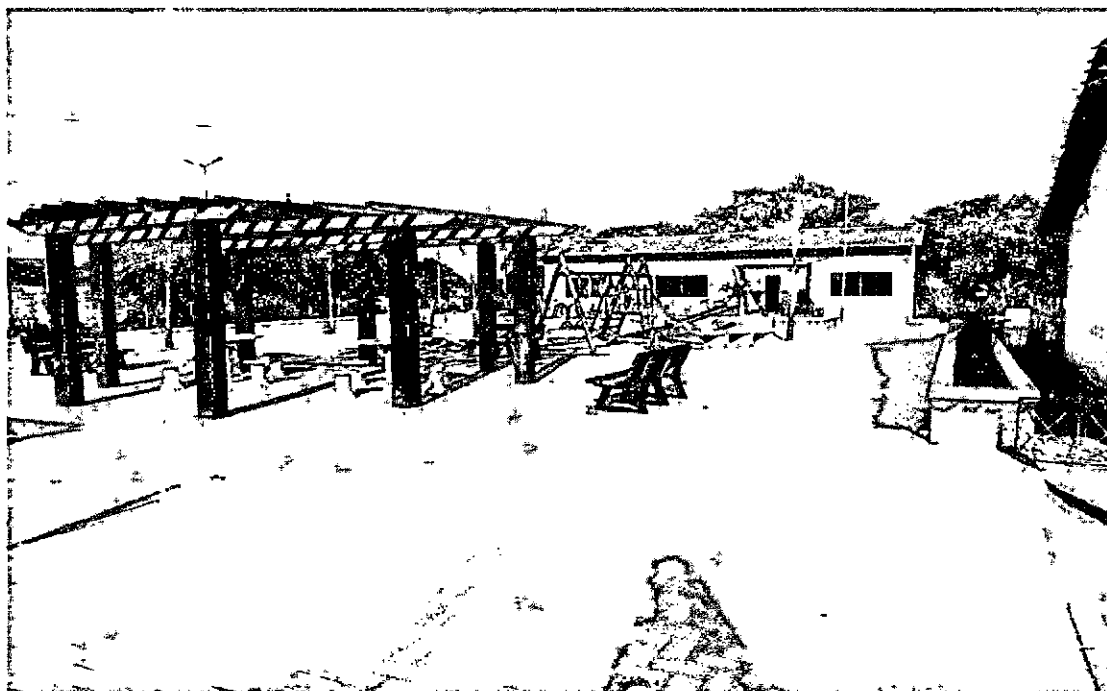




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO




Processo: 24334e24 - Doc. 1289 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARQUES DOS REIS - 25/09/2024 19:19:54
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 14885906-6a98-4f36-a378-6798b1116927

- **Praça da comunidade quilombola Várzea Grande anexo 35:**

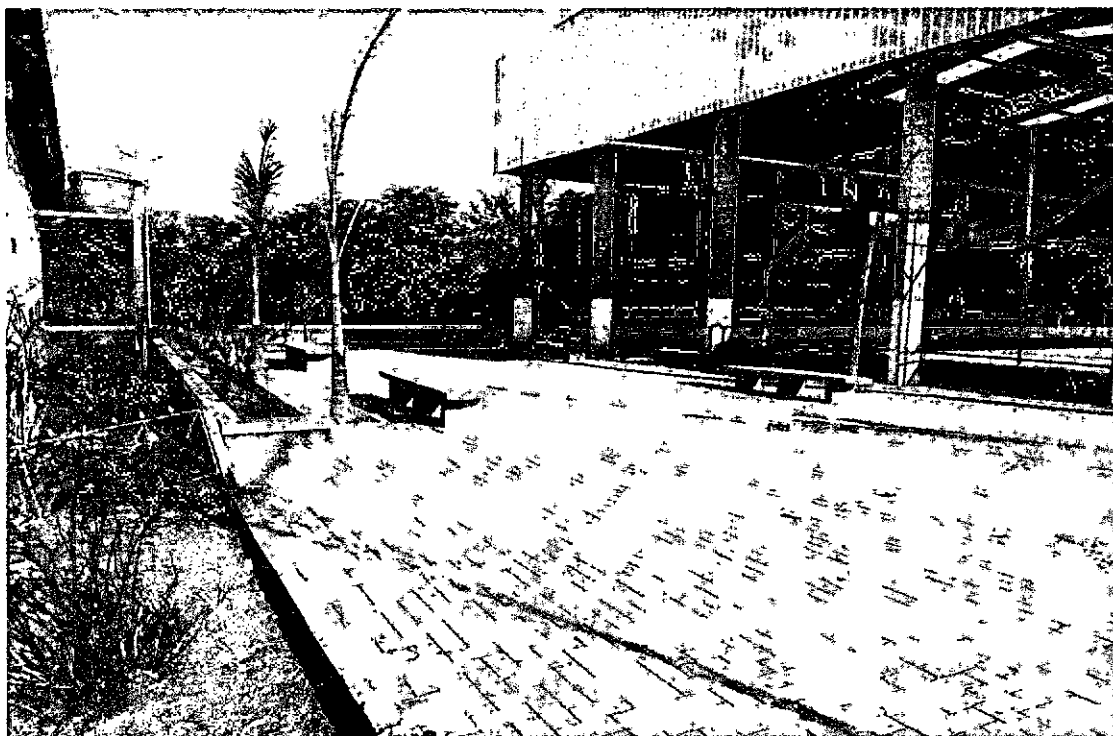

Cipó Ba, setembro de 2024.


Derval dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA: 0520091574
